



Kläranlage Neuhausen a.d.F.

Ertüchtigung der Kläranlage

Statusbericht Gemeinderat 26.10.2021

Dr.-Ing. Michael Seeger

geöffnet am 07.05.2024 um 12:20 Uhr

Gliederung

1. Stand der Arbeiten

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

3. Zeitplan

4. Erläuterungen zum RÜB-A

Gliederung


1. Stand der Arbeiten

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

3. Zeitplan

4. Erläuterungen zum RÜB-A


1. Stand der Arbeiten

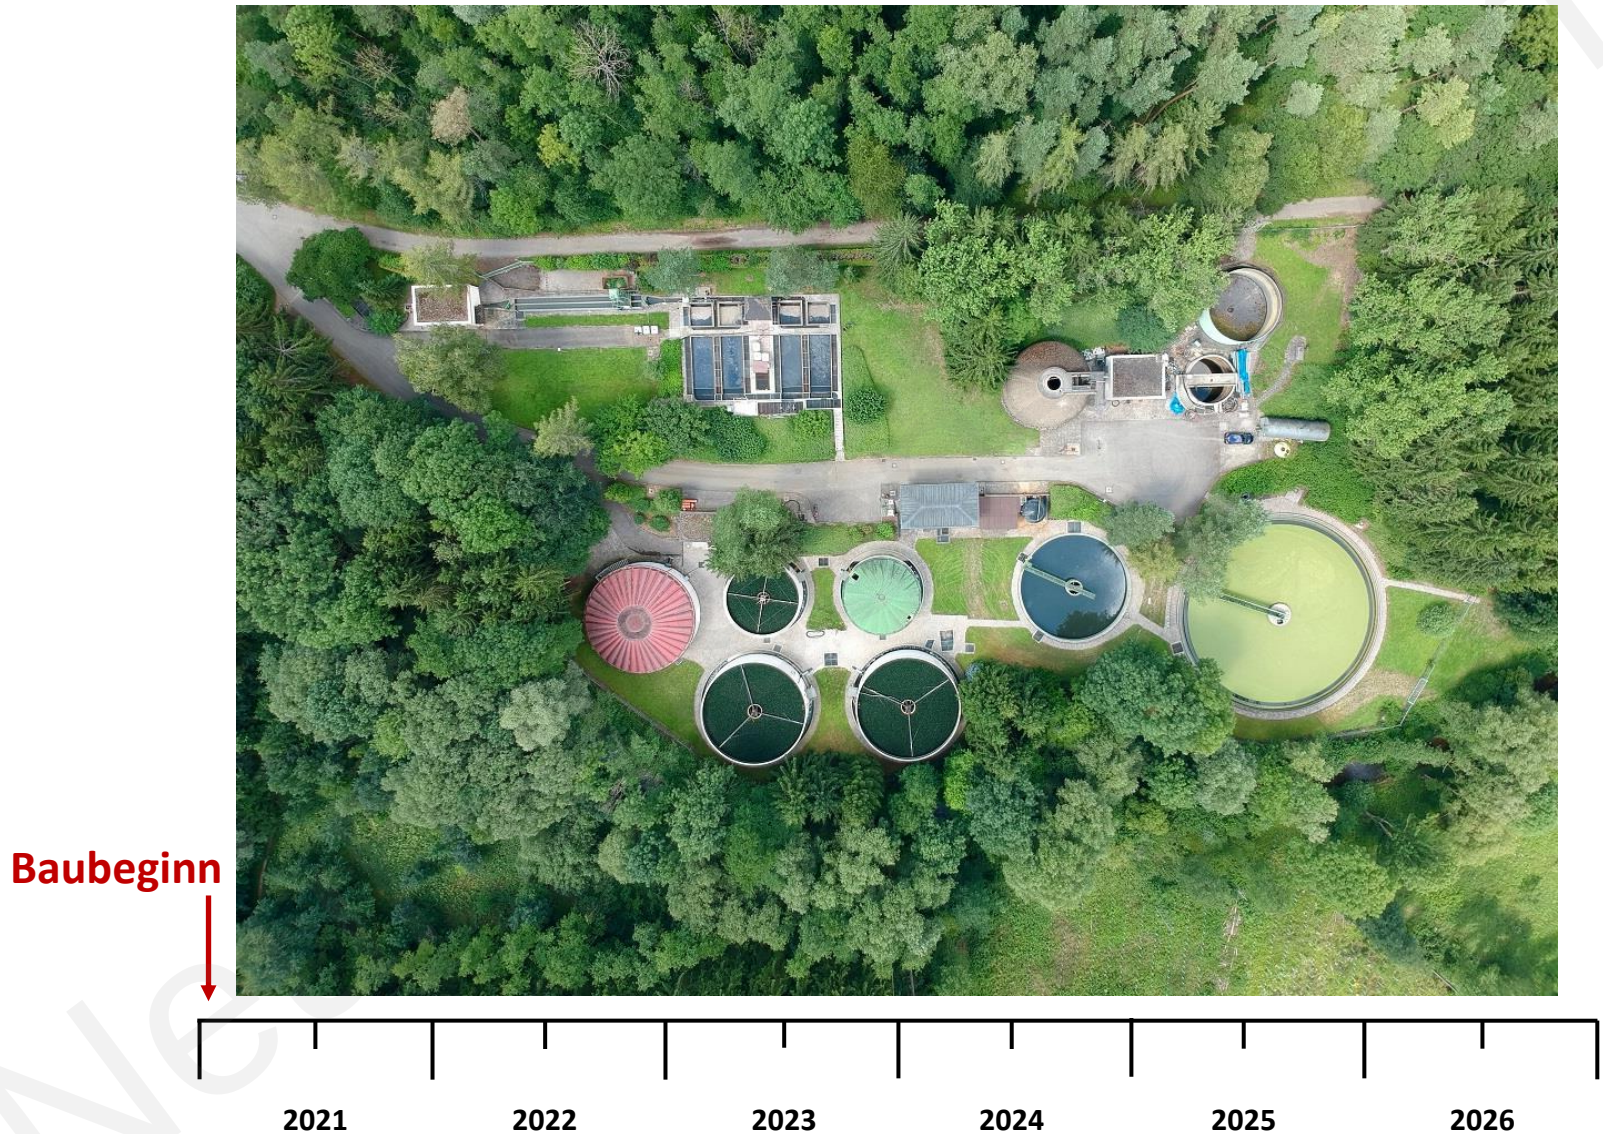


1. Stand der Arbeiten




Baubeginn




1. Stand der Arbeiten




1. Stand der Arbeiten




1. Stand der Arbeiten





1. Stand der Arbeiten



1. Stand der Arbeiten




1. Stand der Arbeiten

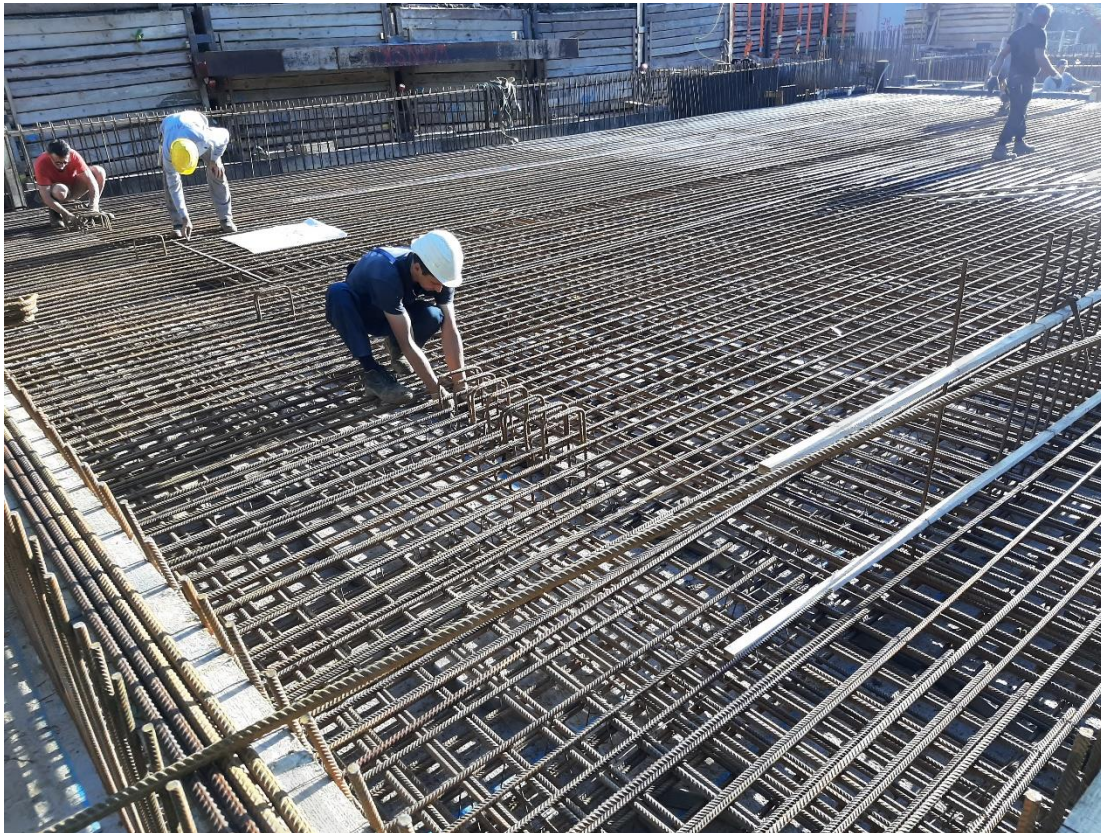


1. Stand der Arbeiten



1. Stand der Arbeiten



1. Stand der Arbeiten



Gliederung

1. Stand der Arbeiten

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

3. Zeitplan

4. Erläuterungen zum RÜB-A

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

2.1 Kostenaufstellung

Gewerk	Rohbau	Schlosserarbeiten	Mschinentechnik	EMSR	SUMME
Firma					[brutto, ohne NK]
Kostenberechnung					
Bepreistes LV					
Vergabesumme					
Ø Angebotspreis					

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

2.1 Kostenaufstellung

Gewerk	Rohbau	Schlosserarbeiten	Mschinentechnik	EMSR	SUMME
Firma					[brutto, ohne NK]
Kostenberechnung	961.387,25 €	106.820,81 €	208.104,17 €	69.261,57 €	1.345.573,80 €
Bepreistes LV					
Vergabesumme					
Ø Angebotspreis					

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

2.1 Kostenaufstellung

Gewerk	Rohbau	Schlosserarbeiten	Mschinentechnik	EMSR	SUMME
Firma					[brutto, ohne NK]
Kostenberechnung	961.387,25 €	106.820,81 €	208.104,17 €	69.261,57 €	1.345.573,80 €
Bepreistes LV	1.007.487,56 €	119.428,40 €	288.441,72 €	83.889,12 €	1.499.246,80 €
Vergabesumme					
Ø Angebotspreis					

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

2.1 Kostenaufstellung

Gewerk	Rohbau	Schlosserarbeiten	Maschinentechnik	EMSR	SUMME
Firma	<i>Gottlob Brodbeck GmbH und Co. KG</i>	<i>Metallbau Heimsch GmbH</i>	<i>Eliquo KGN</i>	<i>Wittinger GmbH</i>	[brutto, ohne NK]
Kostenberechnung	961.387,25 €	106.820,81 €	208.104,17 €	69.261,57 €	1.345.573,80 €
Bepreistes LV	1.007.487,56 €	119.428,40 €	288.441,72 €	83.889,12 €	1.499.246,80 €
Vergabesumme	997.132,90 €	117.761,21 €	339.158,06 €	64.248,58 €	1.518.300,75 €
Ø Angebotspreis					

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

2.1 Kostenaufstellung

Gewerk	Rohbau	Schlosserarbeiten	Maschinentechnik	EMSR	SUMME
Firma	<i>Gottlob Brodbeck GmbH und Co. KG</i>	<i>Metallbau Heimsch GmbH</i>	<i>Eliquo KGN</i>	<i>Wittinger GmbH</i>	[brutto, ohne NK]
Kostenberechnung	961.387,25 €	106.820,81 €	208.104,17 €	69.261,57 €	1.345.573,80 €
Bepreistes LV	1.007.487,56 €	119.428,40 €	288.441,72 €	83.889,12 €	1.499.246,80 €
Vergabesumme	997.132,90 €	117.761,21 €	339.158,06 €	64.248,58 €	1.518.300,75 €
Ø Angebotspreis	1.149.135,46 €	141.098,94 €	343.081,03 €	91.662,21 €	1.724.977,65 €

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

2.2 Rechnungsbilanz

Gewerk	Rohbau	Schlosserarbeiten	Maschinentechnik	EMSR	SUMME
Firma	<i>Gottlob Brodbeck GmbH und Co. KG</i>	<i>Metallbau Heimsch GmbH</i>	<i>Eliquo KGN</i>	<i>Wittinger GmbH</i>	[brutto, ohne NK]
<u>Rechnungen</u>					
Abschlagszahlung 1					
Abschlagszahlung 2					
Abschlagszahlung 3					
Abschlagszahlung 4					
Abschlagszahlung 5					
Abschlagszahlung 6					
Rechnungssumme					
Vergabesumme + Nachträge					
Offener Betrag					

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

2.2 Rechnungsbilanz

Gewerk	Rohbau	Schlosserarbeiten	Mschinentechnik	EMSR	SUMME
Firma	<i>Gottlob Brodbeck GmbH und Co. KG</i>	<i>Metallbau Heimsch GmbH</i>	<i>Eliquo KGN</i>	<i>Wittinger GmbH</i>	[brutto, ohne NK]
<u>Rechnungen</u>					
Abschlagszahlung 1	156.463,37 €				156.463,37 €
Abschlagszahlung 2	149.496,40 €				149.496,40 €
Abschlagszahlung 3	110.456,55 €				110.456,55 €
Abschlagszahlung 4	221.494,63 €				221.494,63 €
Abschlagszahlung 5					
Abschlagszahlung 6					
Rechnungssumme					
Vergabesumme + Nachträge					
Offener Betrag					

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

2.2 Rechnungsbilanz

Gewerk	Rohbau	Schlosserarbeiten	Mschinentechnik	EMSR	SUMME
Firma	<i>Gottlob Brodbeck GmbH und Co. KG</i>	<i>Metallbau Heimsch GmbH</i>	<i>Eliquo KGN</i>	<i>Wittinger GmbH</i>	[brutto, ohne NK]
<u>Rechnungen</u>					
Abschlagszahlung 1	156.463,37 €				156.463,37 €
Abschlagszahlung 2	149.496,40 €				149.496,40 €
Abschlagszahlung 3	110.456,55 €				110.456,55 €
Abschlagszahlung 4	221.494,63 €				221.494,63 €
Abschlagszahlung 5					
Abschlagszahlung 6					
Rechnungssumme	637.910,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	637.910,95 €
Vergabesumme + Nachträge	1.002.040,27 €	117.761,21 €	339.158,06 €	64.248,58 €	1.518.300,75 €
Offener Betrag					

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

2.2 Rechnungsbilanz

Gewerk	Rohbau	Schlosserarbeiten	Mschinentechnik	EMSR	SUMME
Firma	<i>Gottlob Brodbeck GmbH und Co. KG</i>	<i>Metallbau Heimsch GmbH</i>	<i>Eliquo KGN</i>	<i>Wittinger GmbH</i>	[brutto, ohne NK]
<u>Rechnungen</u>					
Abschlagszahlung 1	156.463,37 €				156.463,37 €
Abschlagszahlung 2	149.496,40 €				149.496,40 €
Abschlagszahlung 3	110.456,55 €				110.456,55 €
Abschlagszahlung 4	221.494,63 €				221.494,63 €
Abschlagszahlung 5					
Abschlagszahlung 6					
Rechnungssumme	637.910,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	637.910,95 €
Vergabesumme + Nachträge	1.002.040,27 €	117.761,21 €	339.158,06 €	64.248,58 €	1.518.300,75 €
Offener Betrag	-364.129,32 €	-117.761,21 €	-339.158,06 €	-64.248,58 €	-880.389,80 €
	64 %	0 %	0 %	0 %	42 %

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

2.3 Nachträge

Gewerk	Rohbau	Schlosserarbeiten	Maschinentechnik	EMSR	SUMME
Firma	<i>Gottlob Brodbeck GmbH und Co. KG</i>	<i>Metallbau Heimsch GmbH</i>	<i>Eliquo KGN</i>	<i>Witteringer GmbH</i>	[brutto, ohne NK]
<u>Nachträge</u>					
Nachtrag 1					
Nachtrag 2					
Nachtrag 3					
Nachtrag 4					
Nachtrag 5					
Nachtrag Summe					
prozentiger Anteil der Nachträge zur Vergabesumme					

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

2.3 Nachträge

Gewerk	Rohbau	Schlosserarbeiten	Maschinentechnik	EMSR	SUMME
Firma	<i>Gottlob Brodbeck GmbH und Co. KG</i>	<i>Metallbau Heimsch GmbH</i>	<i>Eliquo KGN</i>	<i>Witteringer GmbH</i>	[brutto, ohne NK]
<u>Nachträge</u>					
Nachtrag 1	7.583,32 €				7.583,32 €
Nachtrag 2	-17.009,50 €				-17.009,50 €
Nachtrag 3	14.333,55 €				14.333,55 €
Nachtrag 4					
Nachtrag 5					
Nachtrag Summe					
prozentiger Anteil der Nachträge zur Vergabesumme					

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

2.3 Nachträge

Gewerk	Rohbau	Schlosserarbeiten	Maschinentechnik
Firma	Gottlob Brodbeck GmbH und Co. KG	Metallbau Heimsch GmbH	Eliquo KGN
<u>Nachträge</u>			
Nachtrag 1	7.583,32 €		
Nachtrag 2	-17.009,50 €		
Nachtrag 3	14.333,55 €		
Nachtrag 4			
Nachtrag 5			
Nachtrag Summe			
prozentiger Anteil der Nachträge zur Vergabesumme			



(vorgezogener) Rückbau Gasbehälter




14.333,55 €

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

2.3 Nachträge

Gewerk	Rohbau
Firma	Gottlob Brodbeck GmbH und Co. KG
Nachträge	
Nachtrag 1	7.583,32 €
Nachtrag 2	-17.009,50 €
Nachtrag 3	14.333,55 €
Nachtrag 4	
Nachtrag 5	
Nachtrag Summe	
prozentiger Anteil der Nachträge zur Vergabesumme	

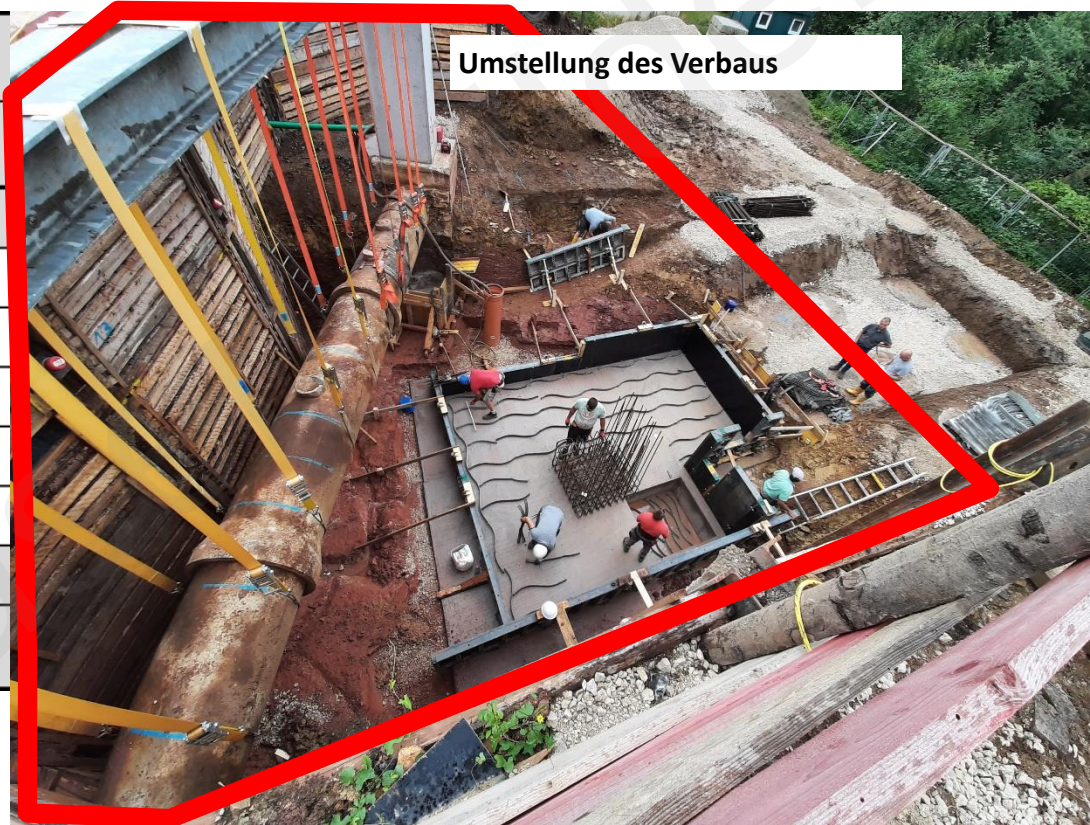

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

2.3 Nachträge

Gewerk	Rohbau
Firma	Gottlob Brodbeck GmbH und Co. KG
<u>Nachträge</u>	
Nachtrag 1	7.583,32 €
Nachtrag 2	-17.009,50 €
Nachtrag 3	14.333,55 €
Nachtrag 4	
Nachtrag 5	
Nachtrag Summe	
prozentiger Anteil der Nachträge zur Vergabesumme	



2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

2.3 Nachträge

Gewerk	Rohbau	Schlosserarbeiten	Maschinentechnik	EMSR	SUMME
Firma	<i>Gottlob Brodbeck GmbH und Co. KG</i>	<i>Metallbau Heimsch GmbH</i>	<i>Eliquo KGN</i>	<i>Wittinger GmbH</i>	[brutto, ohne NK]
<u>Nachträge</u>					
Nachtrag 1	7.583,32 €				7.583,32 €
Nachtrag 2	-17.009,50 €				-17.009,50 €
Nachtrag 3	14.333,55 €				14.333,55 €
Nachtrag 4					
Nachtrag 5					
Nachtrag Summe	4.907,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.907,37 €
prozentiger Anteil der Nachträge zur Vergabesumme	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%

Gliederung

1. Stand der Arbeiten

2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

3. Zeitplan

4. Erläuterungen zum RÜB-A

Bauabschnitt 2



3. Zeitplan

Bauabschnitt 2


Bau Multifunktionsgebäude

Bau Belebungsbecken inkl.
Maschinentechnik im
bestehenden Betriebsgebäude

Erweiterung Rechengebäude
und Neubau Sand- und Fettfang

3. Zeitplan

Bauabschnitt 2

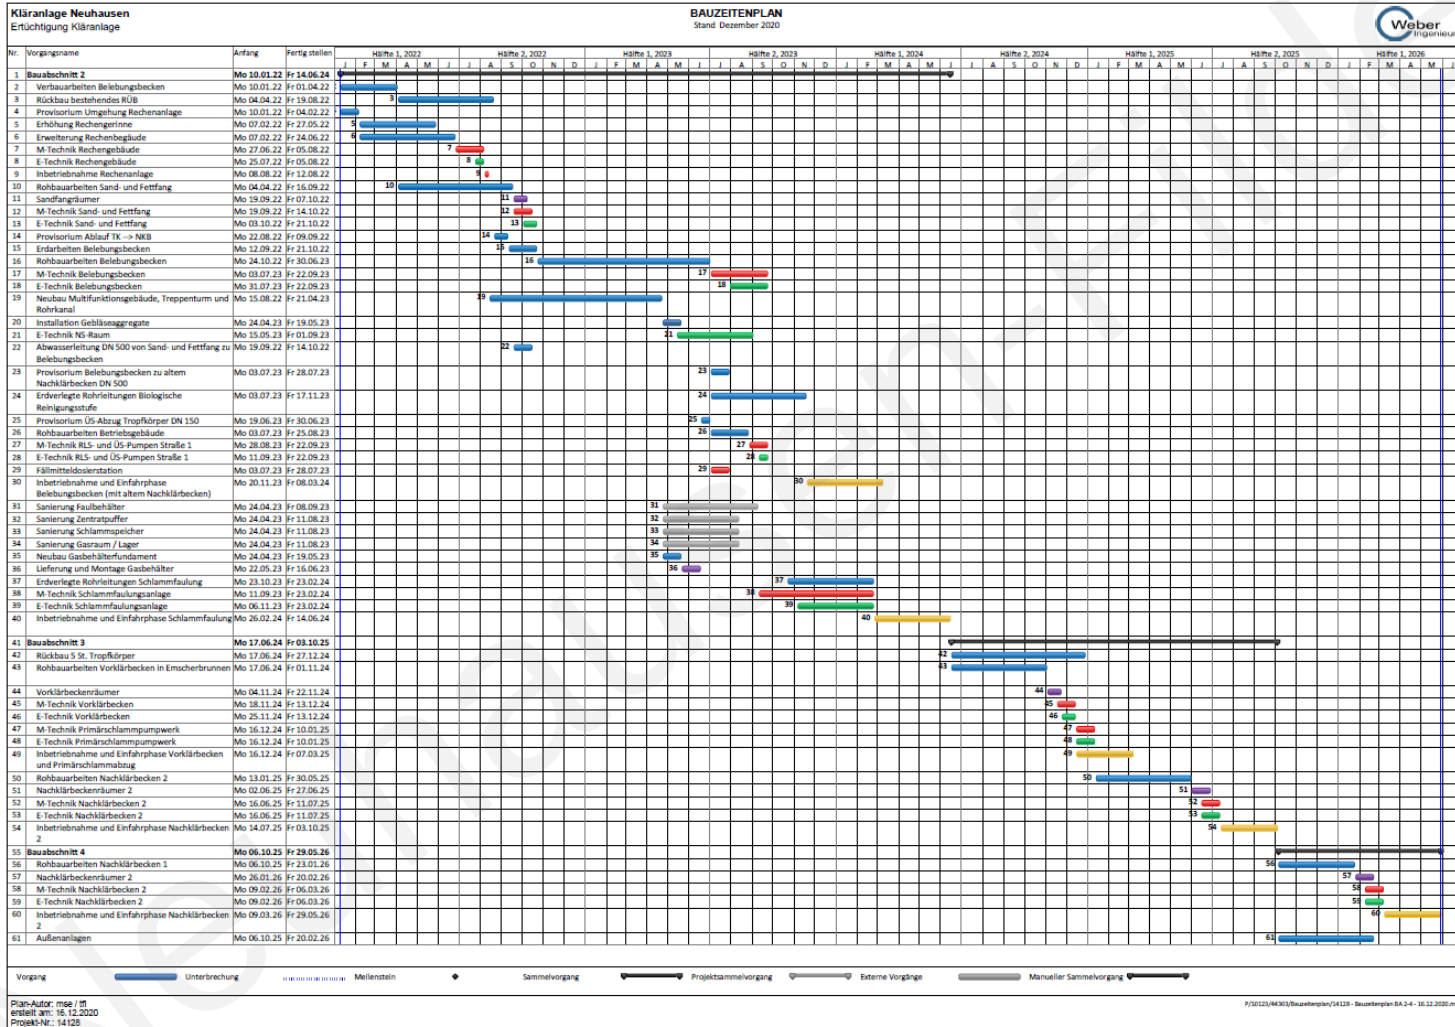


3. Zeitplan

Bauabschnitt 2




Bauabschnitt 1




3. Zeitplan

Bauabschnitt 2

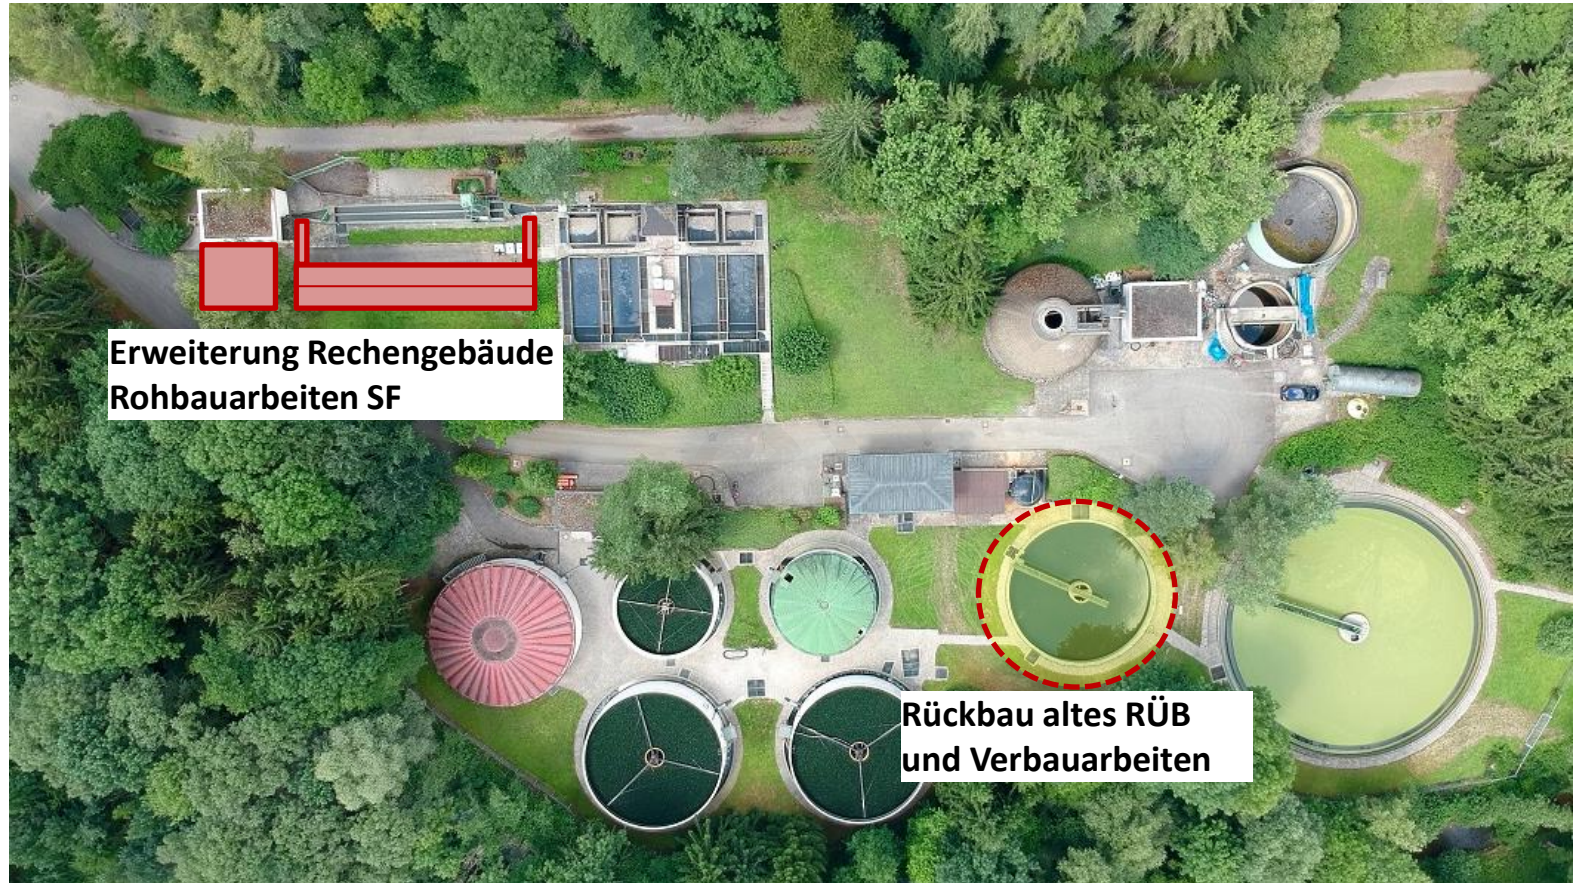


Bauabschnitt 1




3. Zeitplan

Bauabschnitt 2

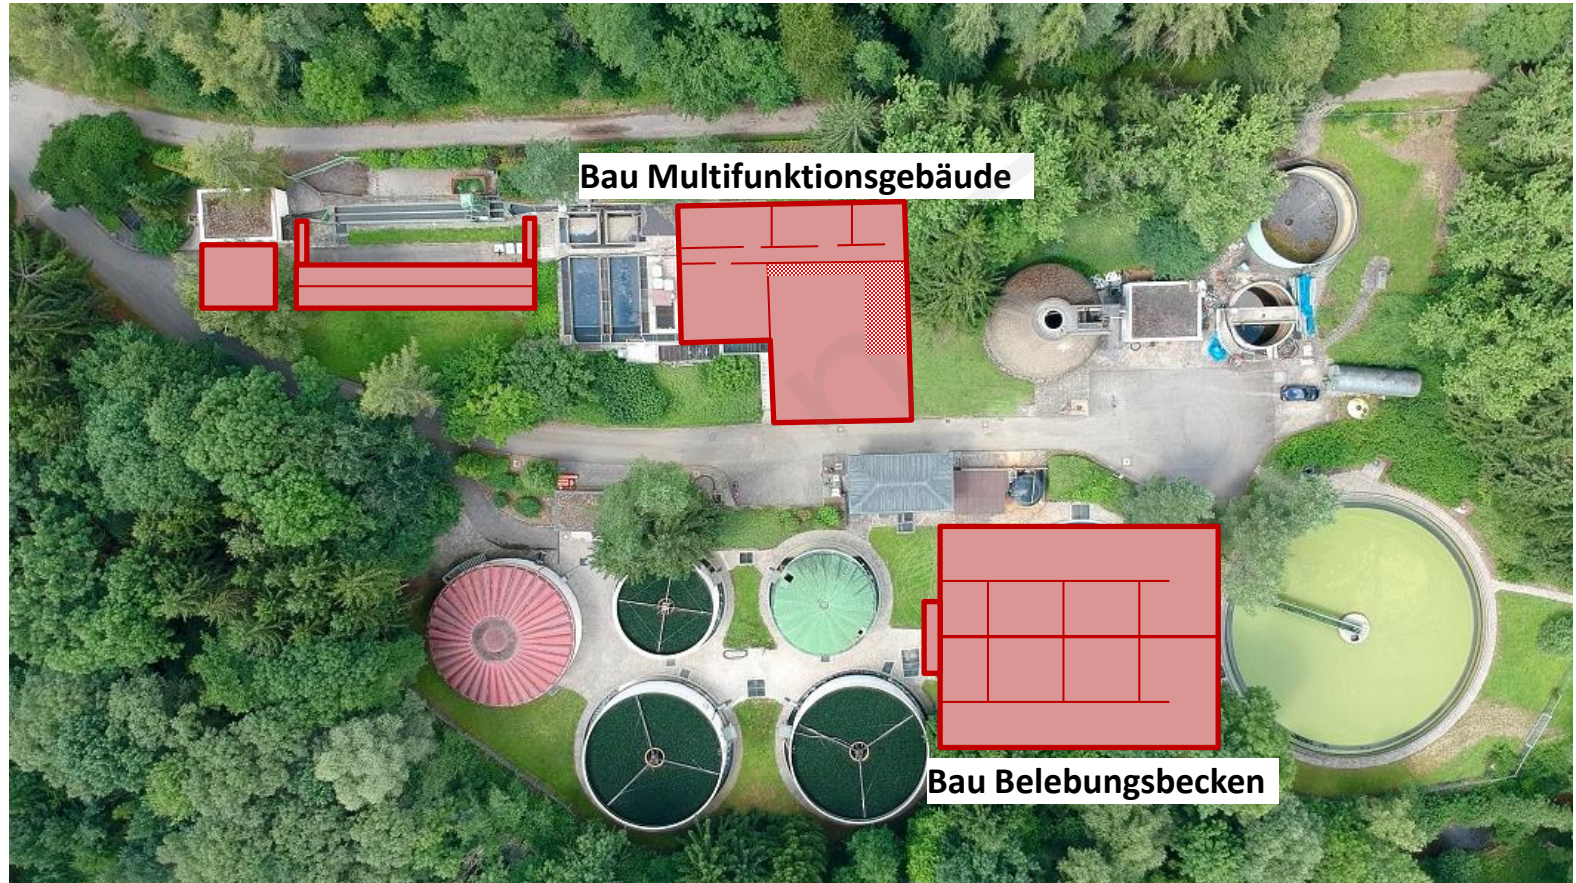


Bauabschnitt 1




3. Zeitplan

Bauabschnitt 2

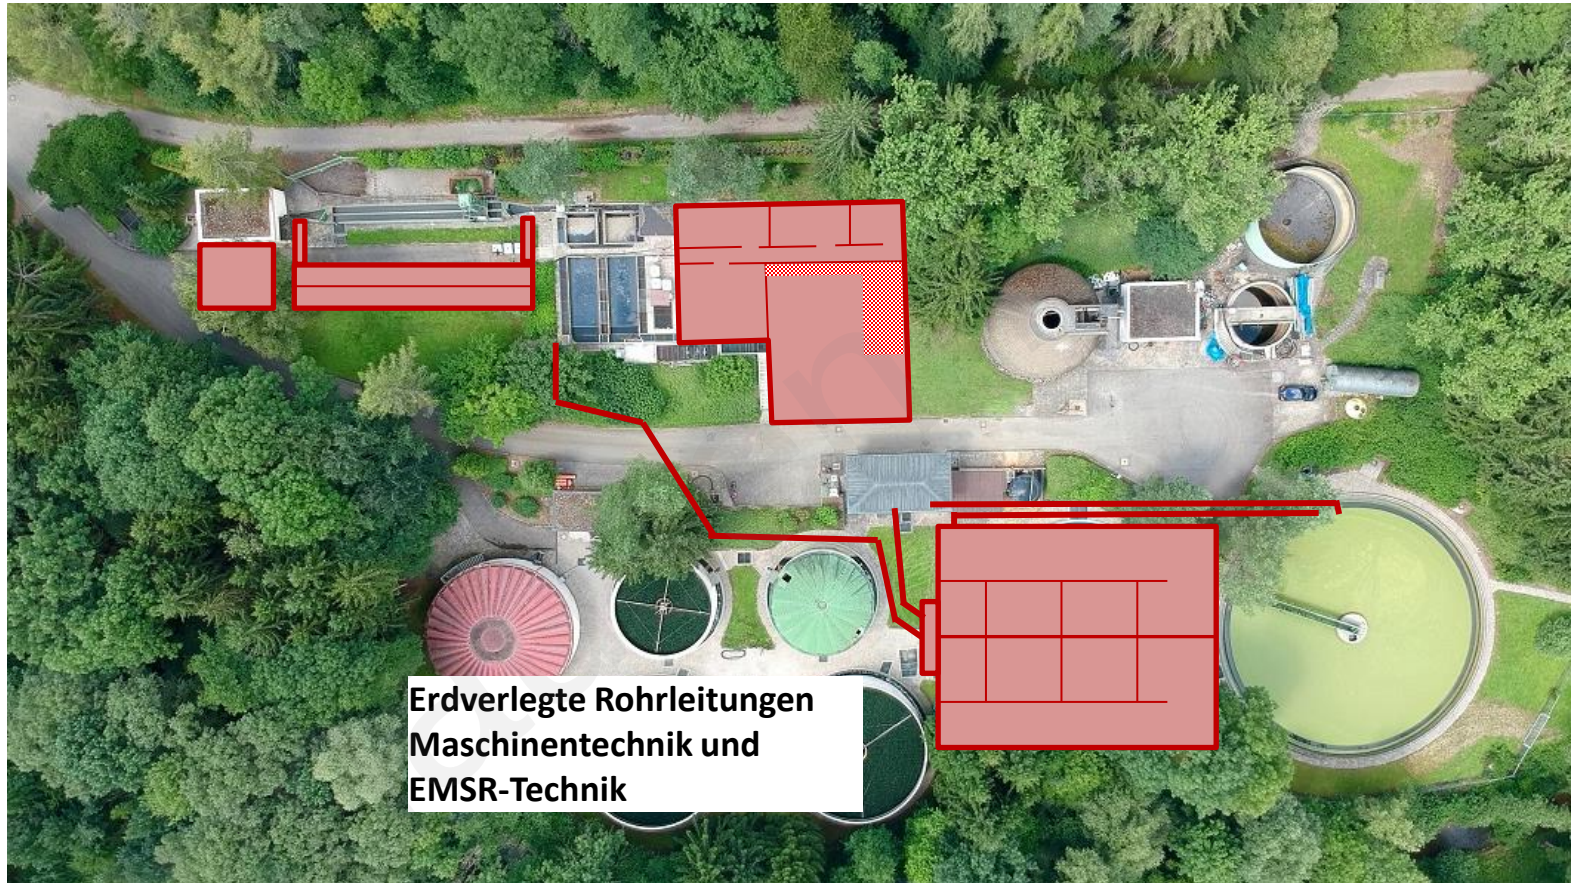


Bauabschnitt 1



3. Zeitplan

Bauabschnitt 2

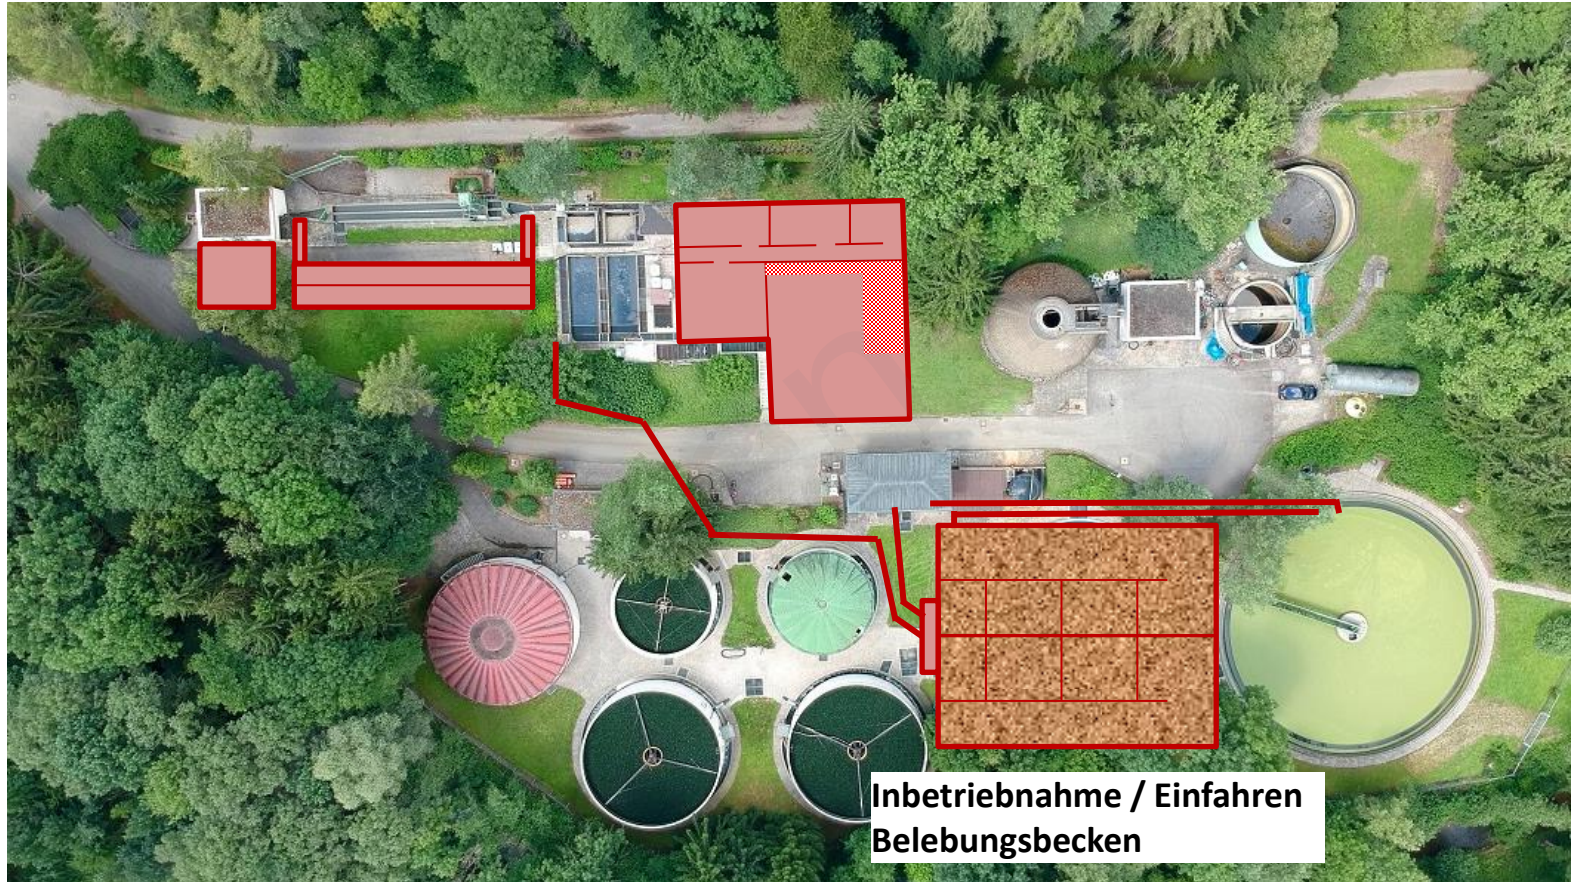

Bauabschnitt 1



Gliederung


1. Stand der Arbeiten



2. Kostenkontrolle / Kostenfortschreibung

3. Zeitplan

4. Erläuterungen zum RÜB-A

4. Erläuterungen zum RÜB-A

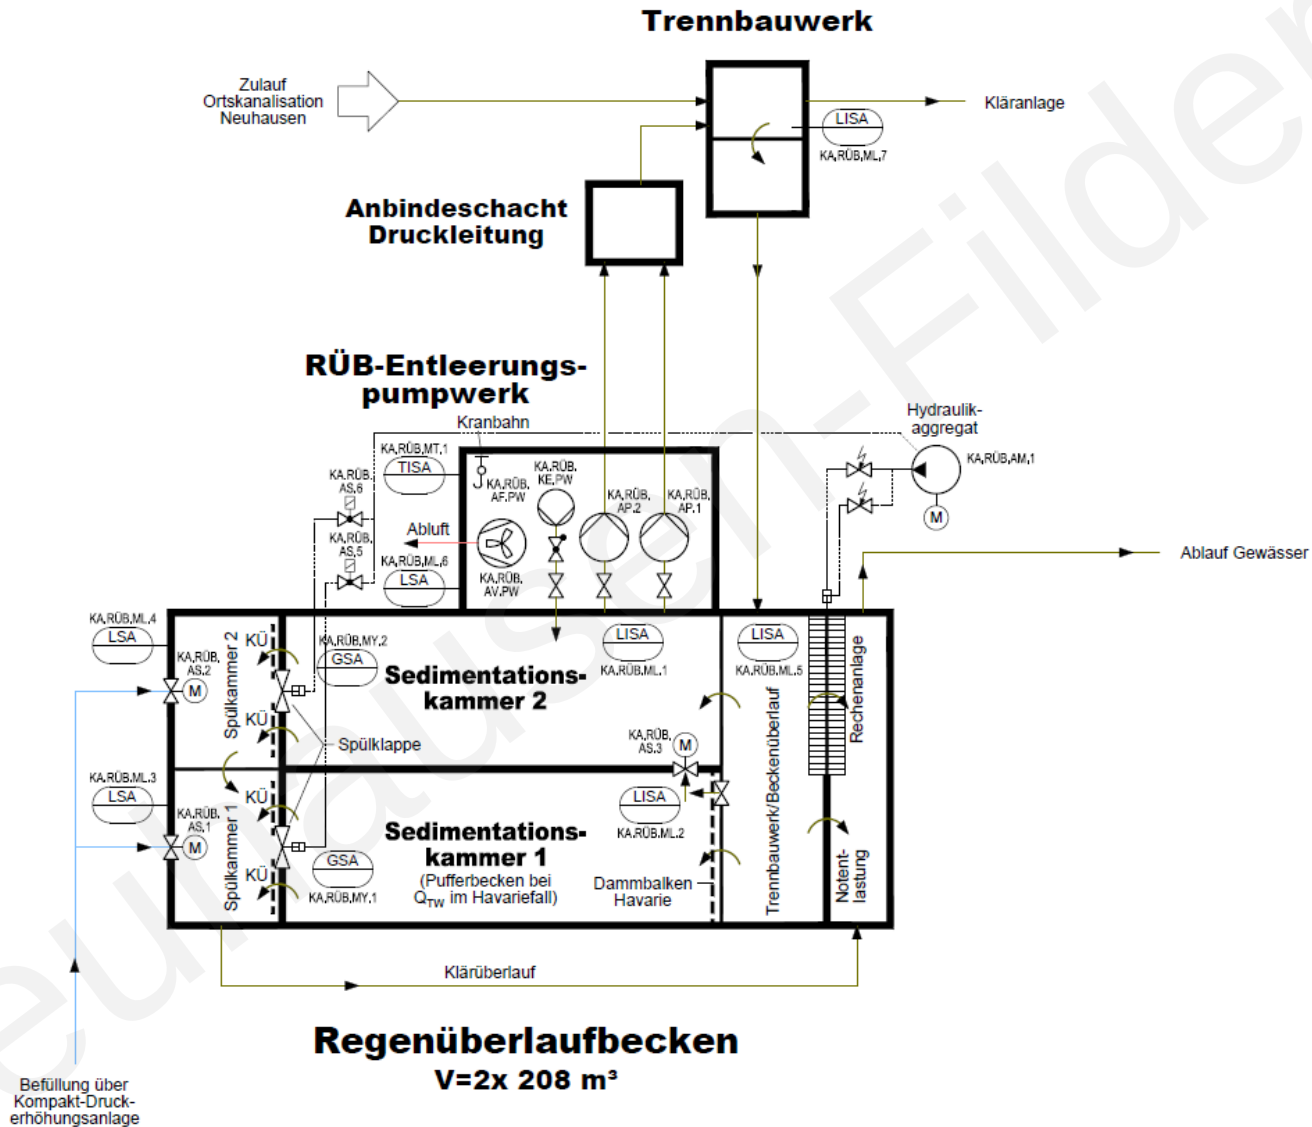

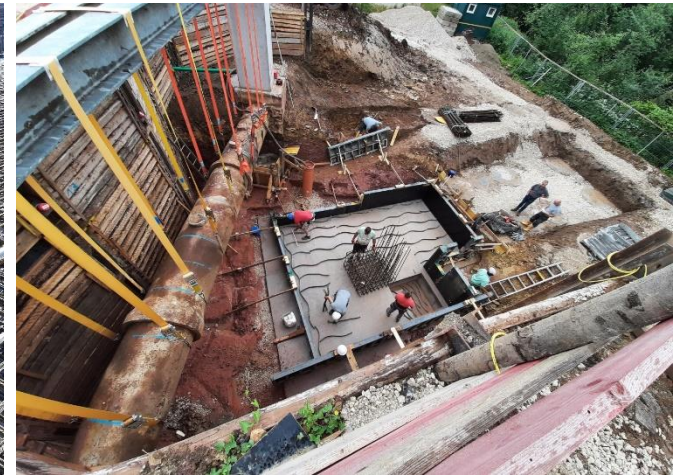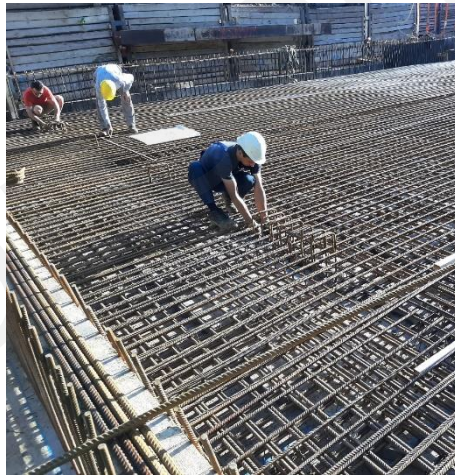

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
