


Sachstandsbericht Kanalsanierung

- Abschluss Maßnahme 2018
- Vorstellung Maßnahme 2019
- Ermächtigung zur Ausschreibung



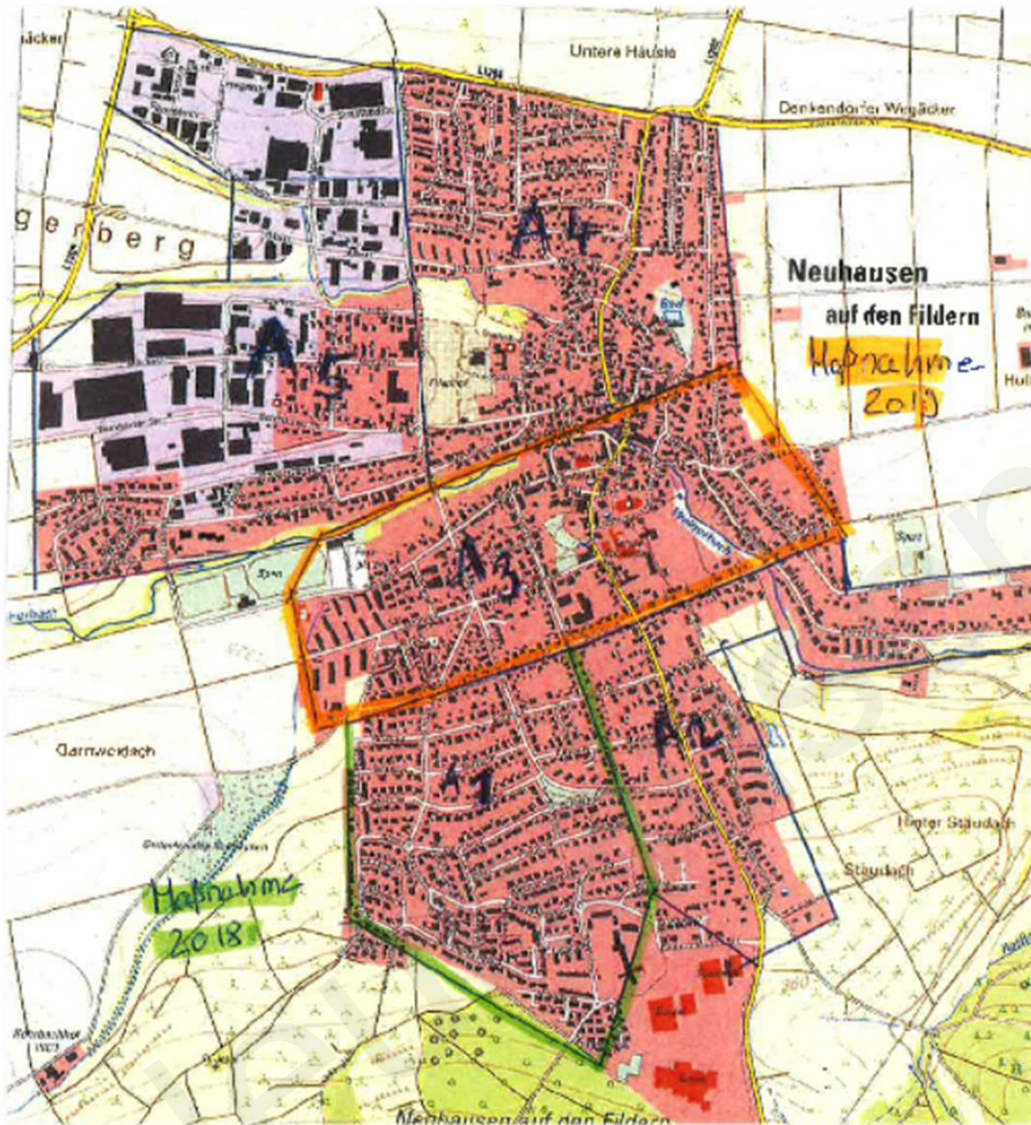

EKVO 2018


- Vergabe- / Auftragssumme 233.200,27 € (brutto)
- Abrechnungssumme 204.127,51 € (brutto)











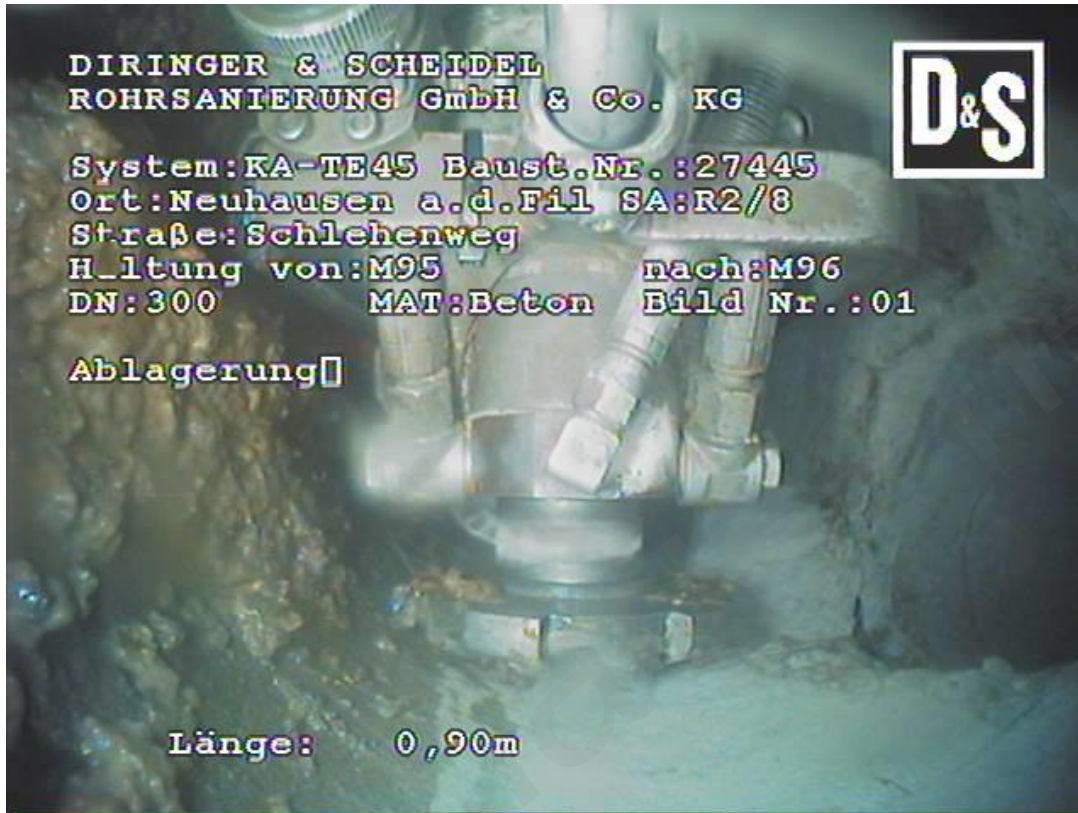

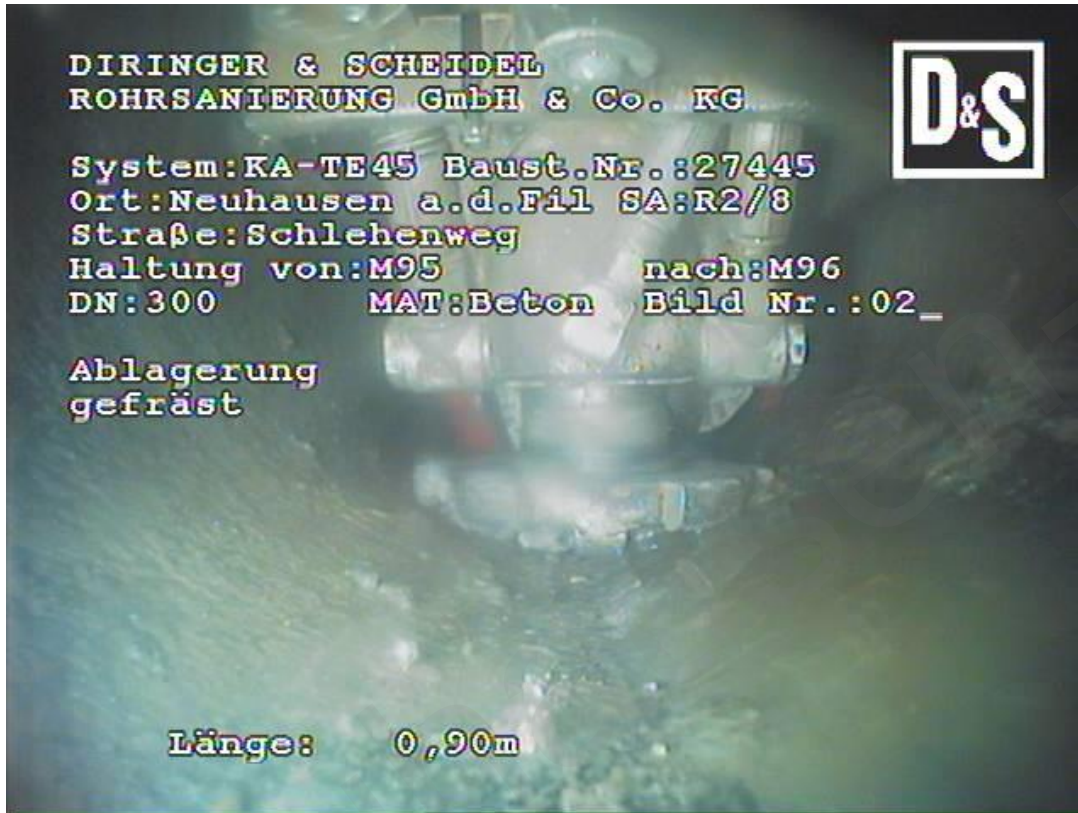

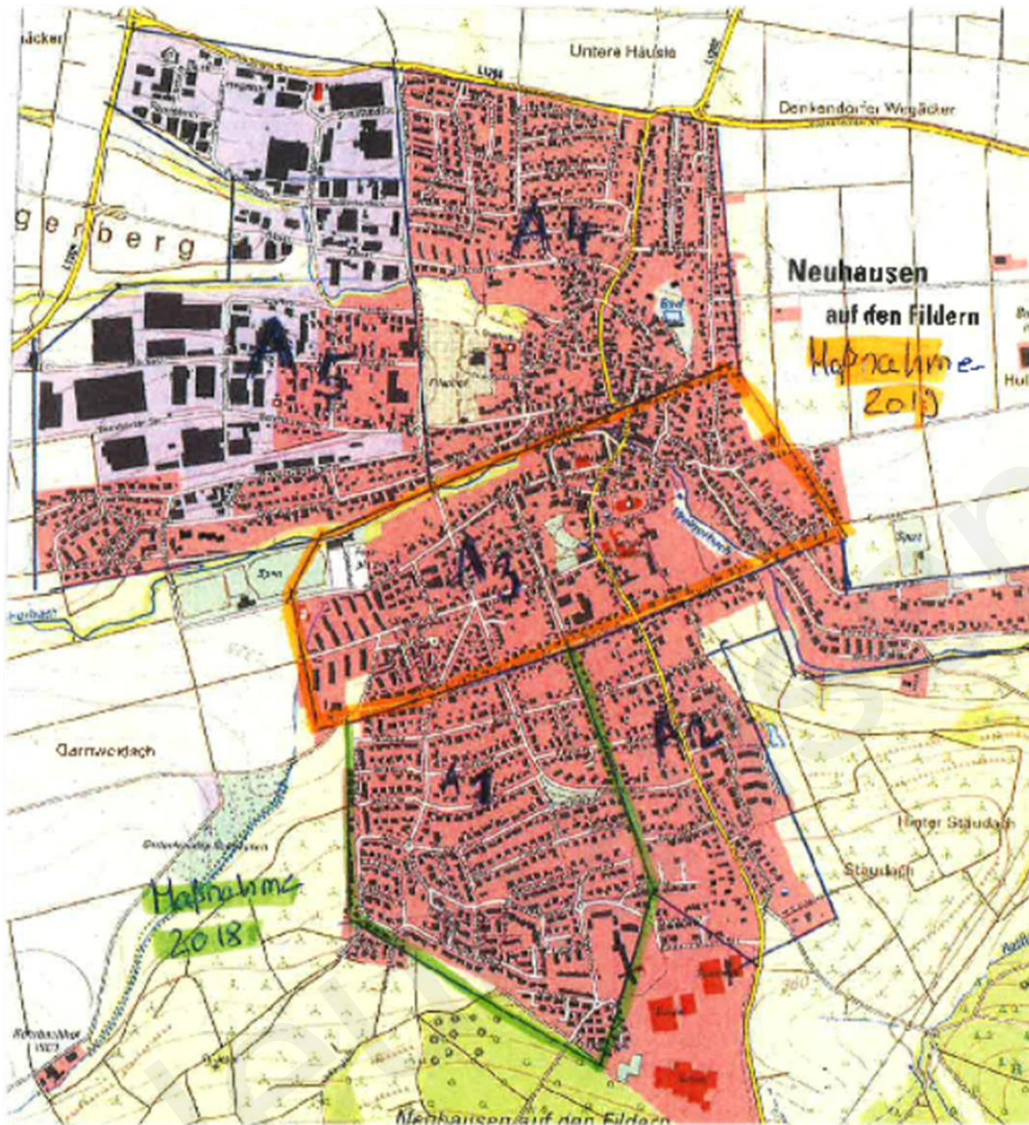



EKVO 2019 - Haltungen

Anfangs-schacht	End-schacht	Straße	Länge	DN	San.-Vorschlag
K 22	K 21	Entlang Rohrbach	36,84	500	Roboter
K 23	K 22	Entlang Rohrbach	48,90	500	Roboter
K 24	K 23	Entlang Rohrbach	46,70	500	Schlauchliner
K 50	K 50A	Erlenweg	19,43	200	Roboter
K 31	K 30	Eschenweg	27,55	300	Roboter
I 67	I 66	Kirchstr.	63,20	200	Roboter
K 25	K 24	Lettenstr.	43,60	500	Roboter
K 26	K 25	Lettenstr.	47,50	400	Roboter
K 27	K 26	Lettenstr.	43,30	400	Roboter
L 41	L 40	Lettenstr.	52,90	250	Roboter
L 42	L 41	Lettenstr.	31,00	250	Roboter
L 43	L 40	Lettenstr.	47,54	250	Roboter
I 63	I 54	Schloßplatz	35,80	300	Schlauchliner
I 64	I 63	Schloßplatz	28,98	250	Schlauchliner
I 66	I 128	Schloßplatz	44,00	250	Roboter
I 128	I 64	Schloßplatz	38,31	250	Schlauchliner
K 21	L 20N	Schloßstr.	18,73	800	Roboter
L 18	L 18N	Schloßstr.	6,91	300	Roboter
L 19	L 18	Schloßstr.	33,54	400	Roboter
L 20	L 19	Schloßstr.	30,50	300	Roboter
K 111	K 111N	Schloßstr.	13,45	250	Roboter
K 112	K 111N	Schloßstr.	27,70	800	Roboter
K 113	K 112	Schloßstr.	51,61	300	Roboter
K 114	K 113	Schloßstr.	51,60	300	Roboter
K 115	K 114	Schloßstr.	51,60	300	Roboter
K 116	K 115	Schloßstr.	50,89	300	Roboter
K 117	K 116	Schloßstr.	30,25	300	Roboter
L 19N	L 18N	Schloßstr.	30,08	900	Roboter
L 20N	L 19N	Schloßstr.	41,80	900	Roboter
K 111N	L 20N	Schloßstr.	34,89	800	Roboter
I 10	I 9	Seestr.	31,92	700	Roboter
I 11	I 10	Seestr.	16,50	700	Roboter
I 12	I 11	Seestr.	16,50	700	Roboter
I 14	I 13	Seestr.	31,50	700	Roboter
I 15	I 14	Seestr.	24,02	700	Roboter
I 71	I 72	Seestr.	26,26	500	Schlauchliner
I 72	I 15	Seestr.	33,40	500	Schlauchliner
I 10A	I 10	Seestr.	3,20	300	Roboter
I 130	I 71	Seestr.	24,49	500	Schlauchliner
K 28	K 27	Talackerstr.	6,30	400	Roboter
K 30	K 29	Talackerstr.	64,20	300	Roboter
K 32	K 30	Talackerstr.	42,07	300	Roboter
K 32A	K 32	Talackerstr.	11,00	200	Roboter
K 36	K 35	Weidenweg	40,70	250	Roboter

Haltungen 44 Länge 1501,16 m


EKVO 2019 - Schächte

Schacht Nummer	Straße	Schachttiefe
K 21	Entlang Rohrbach	2,65
K 22	Entlang Rohrbach	1,63
K 31	Eschenweg	3,24
I 66	Kirchstr.	4,53
I 67	Kirchstr.	3,68
K 25	Lettenstr.	2,50
L 40	Lettenstr.	3,18
L 41	Lettenstr.	2,07
L 42	Lettenstr.	1,36
L 43	Lettenstr.	2,19
I 53	Marktstr.	2,47
I 63	Schloßplatz	3,12
I 64	Schloßplatz	3,63
I 128	Schloßplatz	3,43
L 18	Schloßstr.	1,78
L 19	Schloßstr.	1,36
K 111	Schloßstr.	1,85
K 113	Schloßstr.	1,12
K 114	Schloßstr.	1,34
K 115	Schloßstr.	1,54
K 116	Schloßstr.	1,72
K 117	Schloßstr.	1,83
L 18N	Schloßstr.	3,45
I 9	Seestr.	3,17
I 11	Seestr.	2,73
I 13A	Seestr.	3,58
K 28	Talackerstr.	2,34
K 29	Talackerstr.	2,82
K 30	Talackerstr.	3,91
K 32	Talackerstr.	3,47
K 32A	Talackerstr.	3,04

Schächte gesamt 31





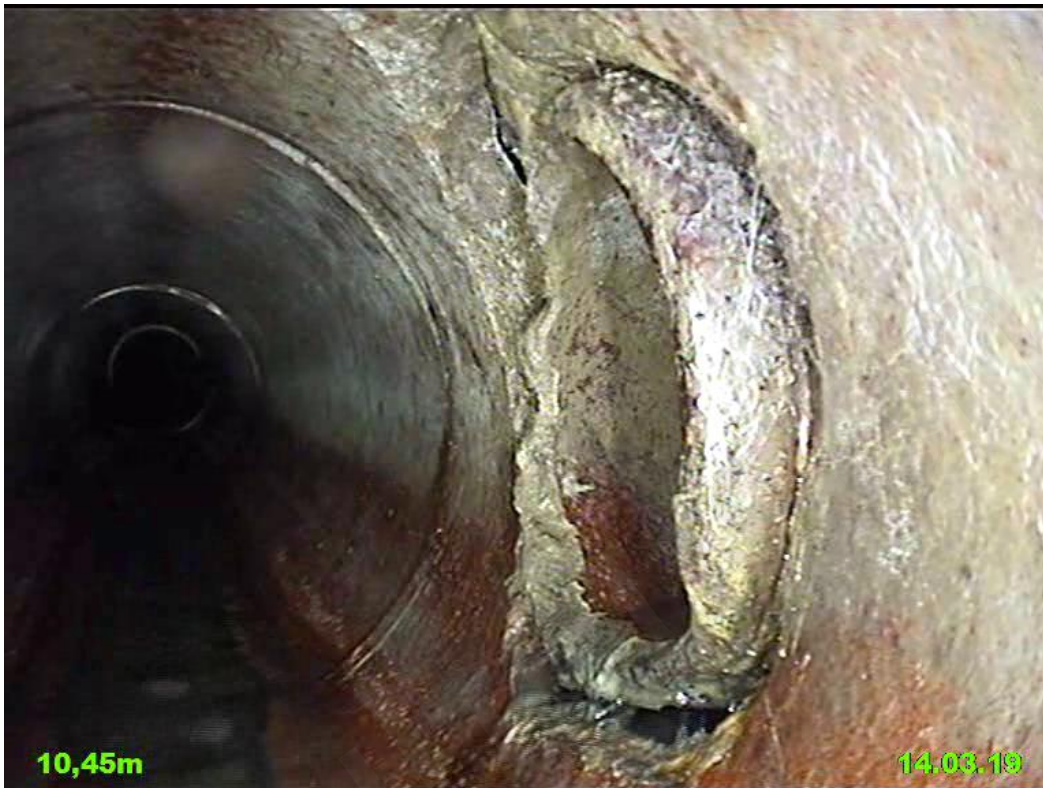

EKVO 2019 - Kostenberechnung

TV-Voruntersuchung netto ca.	11.300,00 €
Baukosten netto ca.	189.000,00 €
Baunebenkosten Netto inklusive TV-Abnahme ca.	38.500,00 €
Summe Netto mit Baunebenkosten ca.	239.000,00 €
Mehrwertsteuer 19 % ca.	45.500,00 €
Gesamtsumme brutto inkl. NK und MwSt. ca.	284.500,00 €

EKVO – Termine und Bauablauf

- Ausgabe LV 10. Mai 2019
- Submission 28. Mai 2019
- Vergabe 25 Juni 2019
- Baubeginn 15. Juli 2019
- Bauende 15. November 2019
