

## Sachstandsbericht Kanalsanierung

- Abschluss Maßnahme 2018
- Vorstellung Maßnahme 2019
- Ermächtigung zur Ausschreibung





## EKVO 2018


- Vergabe- / Auftragssumme 233.200,27 € (brutto)
- Abrechnungssumme 204.127,51 € (brutto)









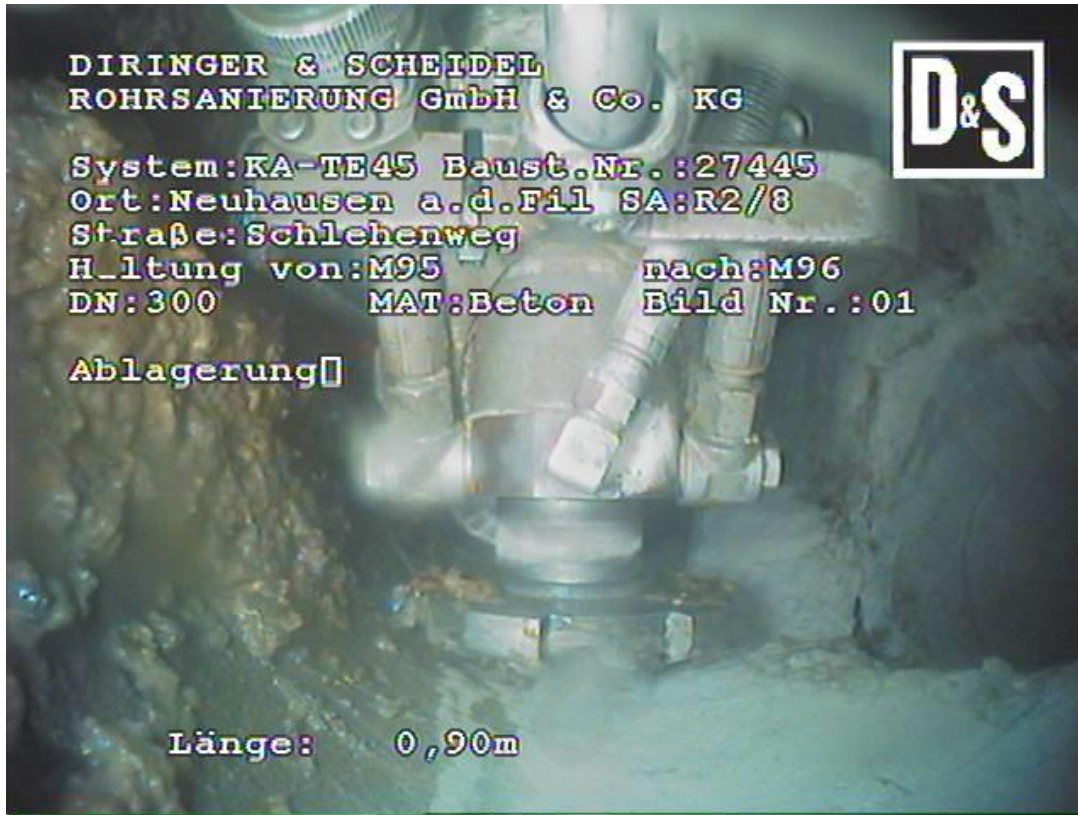







# EKVO 2019 - Haltungen

| Anfangs-schacht | End-schacht | Straße           | Länge | DN  | San.-Vorschlag |
|-----------------|-------------|------------------|-------|-----|----------------|
| K 22            | K 21        | Entlang Rohrbach | 36,84 | 500 | Roboter        |
| K 23            | K 22        | Entlang Rohrbach | 48,00 | 500 | Roboter        |
| K 24            | K 23        | Entlang Rohrbach | 46,70 | 500 | Schlauchliner  |
| K 50            | K 50A       | Erlenweg         | 19,43 | 200 | Roboter        |
| K 31            | K 30        | Eschenweg        | 27,55 | 300 | Roboter        |
| I 67            | I 66        | Kirchstr.        | 63,20 | 200 | Roboter        |
| K 25            | K 24        | Lettenstr.       | 43,60 | 500 | Roboter        |
| K 26            | K 25        | Lettenstr.       | 47,50 | 400 | Roboter        |
| K 27            | K 26        | Lettenstr.       | 43,30 | 400 | Roboter        |
| L 41            | L 40        | Lettenstr.       | 52,90 | 250 | Roboter        |
| L 42            | L 41        | Lettenstr.       | 31,00 | 250 | Roboter        |
| L 43            | L 40        | Lettenstr.       | 47,54 | 250 | Roboter        |
| I 63            | I 54        | Schloßplatz      | 35,80 | 300 | Schlauchliner  |
| I 64            | I 63        | Schloßplatz      | 28,98 | 250 | Schlauchliner  |
| I 68            | I 128       | Schloßplatz      | 44,00 | 250 | Roboter        |
| I 128           | I 64        | Schloßplatz      | 38,31 | 250 | Schlauchliner  |
| K 21            | L 20N       | Schloßstr.       | 18,73 | 800 | Roboter        |
| L 18            | L 18N       | Schloßstr.       | 6,91  | 300 | Roboter        |
| L 19            | L 18        | Schloßstr.       | 33,54 | 400 | Roboter        |
| L 20            | L 19        | Schloßstr.       | 30,50 | 300 | Roboter        |
| K 111           | K 111N      | Schloßstr.       | 13,45 | 250 | Roboter        |
| K 112           | K 111N      | Schloßstr.       | 27,70 | 800 | Roboter        |
| K 113           | K 112       | Schloßstr.       | 51,61 | 300 | Roboter        |
| K 114           | K 113       | Schloßstr.       | 51,60 | 300 | Roboter        |
| K 115           | K 114       | Schloßstr.       | 51,60 | 300 | Roboter        |
| K 116           | K 115       | Schloßstr.       | 50,89 | 300 | Roboter        |
| K 117           | K 116       | Schloßstr.       | 30,25 | 300 | Roboter        |
| L 19N           | L 18N       | Schloßstr.       | 30,08 | 900 | Roboter        |
| L 20N           | L 19N       | Schloßstr.       | 41,80 | 900 | Roboter        |
| K 111N          | L 20N       | Schloßstr.       | 34,89 | 800 | Roboter        |
| I 10            | I 9         | Seestr.          | 31,92 | 700 | Roboter        |
| I 11            | I 10        | Seestr.          | 16,50 | 700 | Roboter        |
| I 12            | I 11        | Seestr.          | 16,50 | 700 | Roboter        |
| I 14            | I 13        | Seestr.          | 31,50 | 700 | Roboter        |
| I 15            | I 14        | Seestr.          | 24,02 | 700 | Roboter        |
| I 71            | I 72        | Seestr.          | 26,26 | 500 | Schlauchliner  |
| I 72            | I 15        | Seestr.          | 33,40 | 500 | Schlauchliner  |
| I 10A           | I 10        | Seestr.          | 3,20  | 300 | Roboter        |
| I 130           | I 71        | Seestr.          | 24,49 | 500 | Schlauchliner  |
| K 28            | K 27        | Talackerstr.     | 6,30  | 400 | Roboter        |
| K 30            | K 29        | Talackerstr.     | 64,20 | 300 | Roboter        |
| K 32            | K 30        | Talackerstr.     | 42,07 | 300 | Roboter        |
| K 32A           | K 32        | Talackerstr.     | 11,00 | 200 | Roboter        |
| K 36            | K 35        | Weidenweg        | 40,70 | 250 | Roboter        |

Haltungen 44      Länge 1501,16 m

# EKVO 2019 - Schächte

| Schacht Nummer | Straße           | Schachttiefe |
|----------------|------------------|--------------|
| K 21           | Entlang Rohrbach | 2,65         |
| K 22           | Entlang Rohrbach | 1,63         |
| K 31           | Eschenweg        | 3,24         |
| I 66           | Kirchstr.        | 4,53         |
| I 67           | Kirchstr.        | 3,68         |
| K 25           | Lettenstr.       | 2,50         |
| L 40           | Lettenstr.       | 3,18         |
| L 41           | Lettenstr.       | 2,07         |
| L 42           | Lettenstr.       | 1,36         |
| L 43           | Lettenstr.       | 2,19         |
| I 53           | Marktstr.        | 2,47         |
| I 63           | Schloßplatz      | 3,12         |
| I 64           | Schloßplatz      | 3,63         |
| I 128          | Schloßplatz      | 3,43         |
| L 18           | Schloßstr.       | 1,78         |
| L 19           | Schloßstr.       | 1,36         |
| K 111          | Schloßstr.       | 1,85         |
| K 113          | Schloßstr.       | 1,12         |
| K 114          | Schloßstr.       | 1,34         |
| K 115          | Schloßstr.       | 1,54         |
| K 116          | Schloßstr.       | 1,72         |
| K 117          | Schloßstr.       | 1,83         |
| L 18N          | Schloßstr.       | 3,45         |
| I 9            | Seestr.          | 3,17         |
| I 11           | Seestr.          | 2,73         |
| I 13A          | Seestr.          | 3,58         |
| K 28           | Talackerstr.     | 2,34         |
| K 29           | Talackerstr.     | 2,82         |
| K 30           | Talackerstr.     | 3,91         |
| K 32           | Talackerstr.     | 3,47         |
| K 32A          | Talackerstr.     | 3,04         |

Schächte gesamt

31



## EKVO 2019 - Schlossplatz



## EKVO 2019 - Lettenstraße



## EKVO 2019 - Kostenberechnung

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| TV-Voruntersuchung netto ca.                  | 11.300,00 €  |
| Baukosten netto ca.                           | 189.000,00 € |
| Baunebenkosten Netto inklusive TV-Abnahme ca. | 38.500,00 €  |
| Summe Netto mit Baunebenkosten ca.            | 239.000,00 € |
| Mehrwertsteuer 19 % ca.                       | 45.500,00 €  |
| Gesamtsumme brutto inkl. NK und MwSt. ca.     | 284.500,00 € |

## EKVO – Termine und Bauablauf

- Ausgabe LV 10. Mai 2019
- Submission 28. Mai 2019
- Vergabe 25 Juni 2019
- Baubeginn 15. Juli 2019
- Bauende 15. November 2019
