

NATurnahe Umgestaltung des Sulzbachs

IM Bereich der Kläranlage in Neuhausen auf den Fildern



Vorstellung Entwurfsplanung
Gemeinderat 16.07.2019


Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten- / Landschaftsarchitekten und Hydrologen



BESTANDSSITUATION

PLANUNGSGEBIET

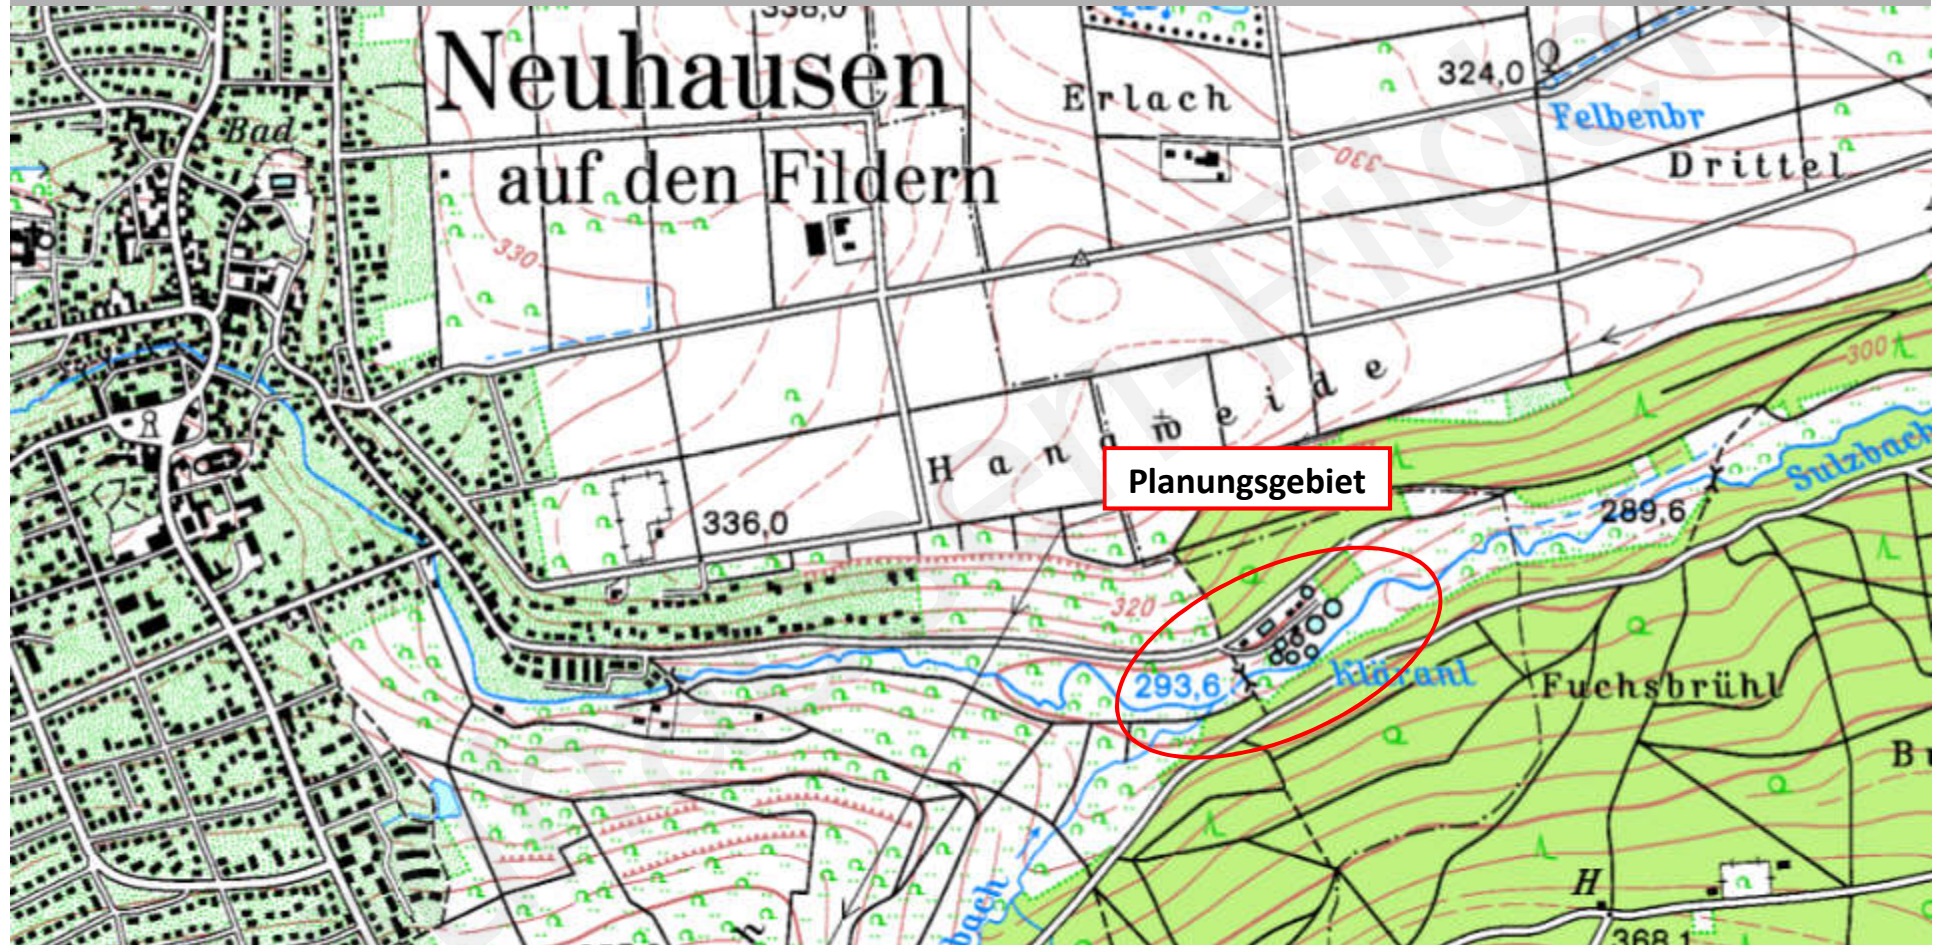

QUELLE: TOP KARTE, UNMAßSTÄBLICH

Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten-/ Landschaftsarchitekten und Hydrologen



geöffnet am 16.05.2024 um 17:44 Uhr

BESTANDSSITUATION

AUSSCHNITT BESTANDSPAN GEWÄSSERENTWICKLUNGSPLAN



QUELLE: GEWÄSSERENTWICKLUNGSPLAN NEUHAUSEN (GEITZ UND PARTNER, 2010).

Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten-/ Landschaftsarchitekten und Hydrologen



geöffnet am 16.05.2024 um 17:44 Uhr

BESTANDSSITUATION

EINMÜNDUNGSBEREICH ROTBACH: SOHLE UND UFER SIND MIT BETONIERTEM PFLASTER GESICHERT
(Abschnitt 6, Blick gegen die Fließrichtung)



BESTANDSSITUATION

BESTEHENDER FUßGÄNGERSTEG ÜBER DEN SULZBACH
(Abschnitt 6, Blick in die Fließrichtung)



BESTANDSSITUATION

MIT STEINSCHÜTTUNG IN SOHLE UND BÖSCHUNG AUSGEBAUTER SULZBACH
ENTLANG DES KLÄRANLAGENGELÄNDES
(Abschnitt 4-5, Blick gegen die Fließrichtung)



BESTANDSSITUATION

KLÄRANLAGENAUSLAUF IN ABSCHNITT 3 DES SULZBACHS
(Abschnitt 3, Blick gegen die Fließrichtung)



BESTANDSSITUATION

BEWERTUNGS- UND MAßNAHMENPLAN DES GEWÄSSERENTWICKLUNGSPLANS NEUHAUSEN

Für den Planungsabschnitt des Sulzbachs und des Rotbachs sind in den Maßnahmenblöcken S2 nachfolgende Maßnahmen formuliert:

- **NATurnahe umgestaltung des Sulzbachs**
→ ENTWICKLUNG NACH SÜDEN
- **AUFFÜLLUNG LINKSUFRIG ENTFERNEN**
→ BEI FLÄCHENUMNUTZUNG



QUELLE: GEWÄSSERENTWICKLUNGSPLAN NEUHAUSEN (GEITZ UND PARTNER, 2010).

Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten-/ Landschaftsarchitekten und Hydrologen



geöffnet am 16.05.2024 um 17:44 Uhr

BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME WIRBELLOSE UND FISCHFAUNA IM RAHMEN GEP 2010 (DR. KAPPUS)



Abbildung 1: Lage der beprobten Gewässerabschnitte (Wirbellose und Fische) auf Gemarkung Neuhausen.

BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME WIRBELLOSE UND FISCHFAUNA IM RAHMEN GEP 2010 (DR. KAPPUS)

Tabelle 1: Fischartenvorkommen auf Gemarkung Neuhausen

Probestelle / Untersuchungspunkt (UP)	Sulzbach oberhalb Markungsgrenze	Rotbach an Wegbrücke	Sulzbach unterhalb Kleintierzucht	Weierbach Ortsmitte	Weierbach oberhalb Sportplatz	Rohrbach oberhalb RÜB	Rohrbach Oberlauf (Stelmingen)	Bühlgraben Unterlauf	Waagenbach oberhalb Umgehungsstraße	Waagenbach unterhalb	Binsach oberhalb Umgehungsstraße	Summe
Art												
UP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Methode	K, E	K	K, E	E	K, E	K	K	K	K, E	K	K, E	
Schmerle	42/3		282	126	117	-/5						567/8
Rotaugen	62											62
Stichling	0/1			1	1				38/16	-/3	0/2	40/6
Bachforelle	5		15	2	5							27
Barsch	20											20
Elritze	0/2				6							6
Rotfeder	3											3
Aal			1									1
Giebel					1							1
Sonnenbarsch										-/1		-/1
Artenzahl	7	0	3	3	4	1	0	0	1	2	1	10
Individuenzahl	132/6	0	298	129	130	-/5	0	0	38	-/4	0/2	727/15

K = Kescherfang E = Elektrofischerei

UP1: Sulzbach Gemarkungsgrenze

- Artenreichster UP mit 7 Arten
- Eigenvermehrung nur bei Schmerle
- Vorkommen auf große Kolke und Totholz konzentriert.

UP2: Rotbach

- Kein Fischvorkommen

UP3: Sulzbach Kleintierzüchter

- 3 Arten
- Eigenvermehrung von Schmerle und Forelle.

BESTANDSSITUATION

SCHUTZGEBIETE



Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten-/ Landschaftsarchitekten und Hydrologen



geöffnet am 16.05.2024 um 17:44 Uhr

BESTANDSSITUATION

ÜBERFLUTUNGSFLÄCHEN HWGK



BESTANDSSITUATION

HYDROLOGIE

Hochwasserabflussscheitelwerte Sulzbach (FGU Körsch)

	Sulzbach oberhalb Einmündung Rotbach (Knoten 103)	Sulzbach unterhalb Einmündung Rotbach (Knoten 105)	Sulzbach unterhalb Kläranlage (Knoten 107)
A _{eo}	36,00 km ²	38,50 km ²	38,6 km ²
MNQ*	109 l/s	112 l/s	--
MQ*	368 l/s	389 l/s	--
HQ ₁₀	26,00 m ³ /s	27,10 m ³ /s	27,40 m ³ /s
HQ ₅₀	36,10 m ³ /s	39,10 m ³ /s	39,40 m ³ /s
HQ ₁₀₀	44,90 m ³ /s	48,50 m ³ /s	49,00 m ³ /s

Klimafaktoren und Hochwasserbemessungsabfluss Sulzbach

	Klimafaktor	Sulzbach oberhalb Einmündung Rotbach (Knoten 103)	Sulzbach unterhalb Einmündung Rotbach (Knoten 105)	Sulzbach unterhalb Kläranlage (Knoten 107)
HQ ₁₀	1,40	36,40 m ³ /s	37,94 m ³ /s	38,36 m ³ /s
HQ ₅₀	1,23	44,40 m ³ /s	48,09 m ³ /s	48,46 m ³ /s
HQ ₁₀₀	1,15	51,64 m ³ /s	55,78 m ³ /s	56,35 m ³ /s

BESTANDSSITUATION

ARTENSCHUTZRECHTLICHE BESTANDSAUFNAHME VÖGEL, FLEDERMÄUSE, HASELMAUS, KÄFER UND SCHMETTERLINGE (GÖG, 2016)

Vögel:

- Nachweis 44 Arten
- Naturschutzfachlich relevante Arten mit Revier außerhalb Wirkraum: Grünspecht, Halsbandschnäpper, Waldlaubsänger, Wendehals, Mittelspecht.
- Revier des Mäusebussard im Bereich Einmündung Rotbach. Verbotstatbestände können nicht ausgeschlossen werden.
- Eine Betroffenheit verschiedener Reviere von Arten der Vorwarnliste (Grauschnäpper, Star, Wacholderdrossel und Weidenmeise) kann nicht ausgeschlossen werden.

Fledermäuse:

- Breites Artenvorkommen mit 13 bzw. 15 nachgewiesenen Arten.
- Mittlere bis hohe Jagdaktivität
- Gebiet zeichnet sich aus durch gute Leitstrukturen, fehlende Straßenbeleuchtung, hohes Quartierpotential für Baumhöhlen und spaltenbeziehende Fledermäuse (58 Quartierpotentialbäume) aus.

Haselmaus, Käfer und Schmetterlinge:

- Keine Nachweise Haselmaus
- Keine Nachweise Nachtkerzenschwärmer
- Keine Nachweise Juchtenkäfer

Fazit 25.7.2018:

- Entwicklungsperspektive der Umgestaltung ist besser als Istzustand
- Konflikte mit Habitatbäumen ausgleichbar über Vermeidungsmaßnahmen und Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich (CEF Maßnahmen).

BESTANDSSITUATION

GEOLOGIE, BODEN, KAMPFMITTEL

Kampfmittel (2019):

- Luftbilddauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienst
- Keine Anhaltspunkte auf Vorhandensein von Sprengbombenblindgänger
- Keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Bodenuntersuchung (terra fusca Ingenieure, 2019):

- 20 cm Oberboden
- Ca. 2m braune Auelehmschicht
- Darunter graue bis weiße Auelehmschicht
- Ca. 2-2,5 m Grundwasserstand

Abfalltechnische Untersuchung (terra fusca Ingenieure, 2019):

- Nach VwV hat Boden die Einstufung Z0 bzw. Z0*, d.h. Boden anderweitig frei verwertbar.
- Nach BBodSchV ist Boden nicht auf landw. Flächen verwertbar (Überschreitung Vorsorgewerte, keine geeignete Konsistenz und Körnung).
- Nach DepV. hat Bodenmaterial DKII, da erhöhte TOC Gehalte. Mit Ausnahmegenehmigung DK0

PLANUNG

LEITBILDCHARAKTER DES SULZBACHS FÜR DIE GEPLANTE UMGESTALTUNG



ENTWURFSPLANUNG, VORABZUG 10.7.2019

LAGEPLAN



Bestand

	Bestandsgehölze
	Historischer Sulzbachverlauf
	Bestehender Sulzbachverlauf
	Altablagerungsfläche

	297.22	Bestandshöhe
	1	Standort Schürfgrube
		Neubau (rot)/Abriss(gelb) H. Künrath/Planung, Weber Ing.
	5900 5923	gemeindeeig. Flurstück Fl.stk. nicht im Eigentum der Gemeinde

Planung

	Gewässer mit Tiefenzonierung
	Standortgerechte Ufervegetation
	Bachböschung
	Röhricht-/ Hochstaudenpflanzung

	Spreitlage
	Wurzelstrunk
	Störsteine
	Steinbühne

Leitungen Bestand

	Kanal
	Wasser
	Fernmeldekabel, Netze BW
	Strom, Netze BW
	Gas
	Telekom

Überschwemmungsgebiete

	Grenze HQ ₁₀
	Grenze HQ ₅₀
	Grenze HQ ₁₀₀

Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten-/ Landschaftsarchitekten und Hydrologen



ENTWURFSPLANUNG, VORABZUG 10.7.2019

AUSSCHNITT LAGEPLAN WESTLICHER BEREICH



Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten- / Landschaftsarchitekten und Hydrologen



ENTWURFSPLANUNG, VORABZUG 10.7.2019

QUERPROFIL 4



Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten-/ Landschaftsarchitekten und Hydrologen



ENTWURFSPLANUNG, VORABZUG 10.7.2019

AUSSCHNITT LAGEPLAN MITTLERER BEREICH



Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten-/ Landschaftsarchitekten und Hydrologen



ENTWURFSPLANUNG, VORABZUG 10.7.2019

QUERPROFIL 6



Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten-/ Landschaftsarchitekten und Hydrologen



ENTWURFSPLANUNG, VORABZUG 10.7.2019

AUSSCHNITT LAGEPLAN ÖSTLICHER BEREICH



Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten- / Landschaftsarchitekten und Hydrologen



ENTWURFSPLANUNG, VORABZUG 10.7.2019

QUERPROFIL 7



Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten- / Landschaftsarchitekten und Hydrologen



NATurnaHER GEWÄSSERBAU

STRUKTURELEMENTE / INGENIEURBIOLOGIE



Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten- / Landschaftsarchitekten und Hydrologen



geöffnet am 16.05.2024 um 17:44 Uhr

WURZELSTRUNK



HUFEISENFÖRMIGE STÖRSTEINGRUPPE



STEINBUHNE



FASCHINENBUHNE



RÖHRICHT- / VEGETATIONSWALZE



TOTHOLZ



Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten-/ Landschaftsarchitekten und Hydrologen



geöffnet am 16.05.2024 um 17:44 Uhr

PROJEKTBEISPIELE

EHEMALIGES WEHR LAHRENSMÜHLE, LEONBERG



Geitz & Partner GbR, Stuttgart
Freie Garten-/ Landschaftsarchitekten und Hydrologen



geöffnet am 16.05.2024 um 17:44 Uhr

PROJEKTBEISPIELE

BRENTZ IN GIENGEN



Geitz & Partner GbR, Stuttgart
Freie Garten-/ Landschaftsarchitekten und Hydrologen



geöffnet am 16.05.2024 um 17:44 Uhr

PROJEKTBEISPIELE

RANKBACH IN RENNINGEN



Geitz & Partner GbR, Stuttgart
Freie Garten-/ Landschaftsarchitekten und Hydrologen



geöffnet am 16.05.2024 um 17:44 Uhr

PROJEKTBEISPIELE

RANKBACH IN RENNINGEN



Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten- / Landschaftsarchitekten und Hydrologen



geöffnet am 16.05.2024 um 17:44 Uhr

ENTWURFSPLANUNG, VORABZUG 10.7.2019

BAUSTELLENERSCHLIEßUNG / BAUABLAUF



Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten- / Landschaftsarchitekten und Hydrologen



ENTWURFSPLANUNG, VORABZUG 10.7.2019

BAUSTELLENERSCHLIEßUNG / BAUABLAUF

Kläranlagenumgestaltung:

Der Bau der Kläranlagenumgestaltung muss soweit fortgeschritten sein, dass die neuen Böschungen/Stützmauer der Kläranlage zur Sulzbachaua erstellt sind, bevor mit der Sulzbachumgestaltung begonnen werden kann.

Sulzbachumgestaltung:

1. Winterhalbjahr bis 28.Feb.: Gehölzfällarbeiten
2. Ab 28. Feb. Beginn Tiefbauarbeiten:
 - Abfischung des Gesamtabschnitts nach Forellenschonzeit
 - Bauerschließung über Treppenweg
 - Einrichtung Bodenzwischenlagerfläche auf Bolzplatz
 - Erstellung neue Sulzbachschlinge mit neuem Steg auf Höhe Profil 5 mit Stillegung alter Bachlauf.
 - Erstellung Baustraßensystem nach Osten und Umbau Sulzbach von unterstrom her.
 - Umsetzen Baustraßensystem nach Westen und Umbau Sulzbach nach oberstrom.
 - Rückbau Baustraßen und Rekultivierung
3. Gesamtbauzeit ca. 1 Jahr und 3 Monate von Januar an.
Es ist für das zweite Winterhalbjahr eine Befreiung für Bauen innerhalb der Forellenschonzeit erforderlich.

PROJEKTKOSTEN

- Lt. Kostenberechnung vom 12.7.2019 ergeben sich nachfolgende Bruttobaukosten incl. Baunebenkosten:

ca. 983.000,- €

- Lt. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft davon förderfähig: 825.000,-€ (Abzug Planungspauschale, vmtl. Fussgängersteg).
- Fördersatz 85%: Förderung = 701.000,- €
- Verbleibender Eigenanteil Neuhausen: 282.000,- €

WEITERES VORGEHEN

- Juli – Aug. 19: Hydraulische Berechnung und Nachweis Hochwasserneutralität
- Ende Aug. 19: Einreichen Wasserrechtsgesuch
- Ende 19: Vorliegen wasserrechtliche Entscheidung, Stellen Förderantrag
- Apr./Mai 20: Vorliegen Förderbescheid
- Sommer / Herbst 20: Ausführungsplanung und Erstellen Ausschreibung
- Winter 20: Ausschreibung und Vergabe
- Januar 21: Baubeginn, sofern Kläranlagenumbau bis dahin soweit, ansonsten später.

NATurnahe Umgestaltung des Sulzbachs

IM Bereich der Kläranlage in Neuhausen auf den Fildern

- VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT -

NATurnaHE UMGESTALTUNG DES SULZBACHS

IM BEREICH DER KLÄRANLAGE IN NEUHAUSEN AUF DEN FILDERN

Naturnahe Umgestaltung des Sulzbachs im Bereich der Kläranlage in Neuhausen a.d.F.

Kostenberechnung nach DIN 276-4					
Nr.	Kostengruppe	Masse	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
200	Kosten des Herrichtens und Erschließens				
210	Herrichten				
211	Sicherungsmaßnahmen				
	Stammschutz	10,00	Stk	95,00 €	950,00
	Summe Sicherungsmaßnahmen				950,00 €
212	Abbruchmaßnahmen				
	Summe Abbruchmaßnahmen				23.211,00 €
214	Herrichten der Geländeoberfläche				
	Summe Herrichten der Geländeoberfläche				43.840,00 €
219	Herrichten sonstiges				
	Summe Herrichten sonstiges				35.000,00 €
	Summe Herrichten 200				103.001,00 €
500	Außenanlagen				
510	Geländeflächen				
511	Oberbodenarbeiten				
	Summe Oberbodenarbeiten				13.545,00 €
512	Bodenarbeiten				
	Summe Bodenarbeiten				84.361,00 €
	Summe Geländeflächen 510				97.906,00 €
520	Befestigte Flächen				
522	Wege, Straßen, Stellplätze				
	Summe Wege, Straßen, Stellplätze				34.000,00 €
	Summe befestigte Flächen 520				34.000,00 €
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen				
531	Einfriedungen				
	Summe Einfriedungen				2.997,50 €
536	Brücken und Stege				
	Summe Brücken und Stege				65.000,00 €
	Summe Baukonstruktionen 530				67.100,00 €

570	Pflanz- und Saatflächen				
571	Oberbodenarbeiten				
	Summe Oberbodenarbeiten				5.680,00 €
572	Vegetationst. Bodenbearbeitung				
	Summe Veget. Bodenbearbeitung				3.520,00 €
573	Sicherungsbauweisen				
	Summe Sicherungsbauweisen				101.260,00 €
574	Pflanzen				
	Summe Pflanzen				10.300,00 €
575	Rasearbeiten				
	Summe Rasearbeiten				16.570,00 €
	Summe Pflanz- und Saatfl. 570				136.610,00 €
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen				
591	Baustelleneinrichtung				
	Summe Baustelleneinrichtung				90.650,00 €
593	Sicherungsmaßnahmen				
	Summe Sicherungsmaßnahmen				1.667,00 €
596	Materialentsorgung				
	Summe Materialentsorgung				95.120,00 €
599	Sonstiges, Stundenlohnarbeiten				
	Summe Sonstiges, Stundenlohnarbeiten				20.000,00 €
	Summe sonstige Maßnahmen 590				207.437,00 €
700	Baunebenkosten				
	Summe Baunebenkosten				180.134,83 €
	Summe Kostengruppe 700				180.134,83 €
	Gesamtkosten ohne Baunebenkosten				646.054,00 €
	Baunebenkosten				180.134,83 €
	Gesamtkosten mit Baunebenkosten				826.188,83 €
	gesetzl. Umsatzsteuer (19%)				156.975,88 €
	Gesamtkosten, brutto				983.164,71 €

Geitz & Partner GbR, Stuttgart

Freie Garten-/ Landschaftsarchitekten und Hydrologen



geöffnet am 16.05.2024 um 17:44 Uhr
