

Sachstandsbericht Kanalsanierung

- Abschluss Maßnahme 2020
- Ausblick Maßnahme 2021

■ Maßnahme 2020

■ Maßnahme 2021

■ Maßnahme 2019

■ Maßnahme 2018

Neuhausen
auf den Fildern



EKVO 2020



EKVO 2020 - Schlauchliner




EKVO 2020 - Schlauchliner



EKVO 2020 - Schlauchliner



EKVO 2020 - Schlauchliner

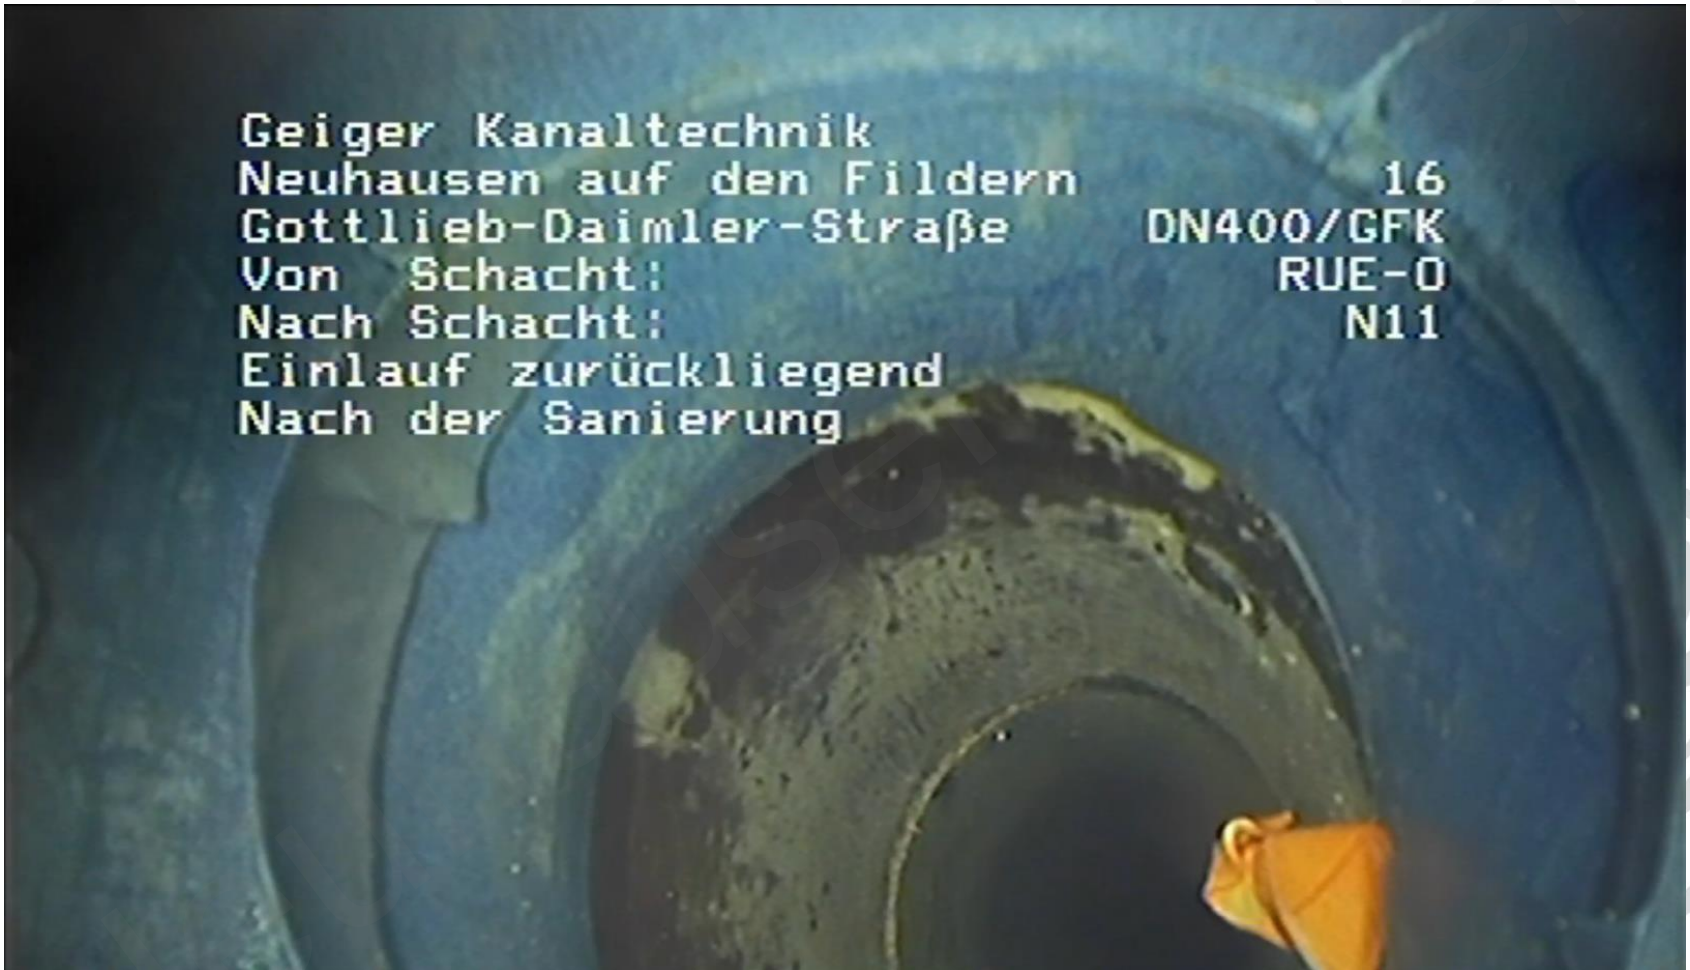

EKVO 2020 - Stutzensanierung

Neuhausen
auf den Fildern



EKVO 2020 - Stutzensanierung



EKVO 2020

- Kostenberechnung 244.443,85 € (brutto)
- Vergabe- / Auftragssumme 184.561,07 € (brutto)
- Abrechnungssumme 212.840,63 € (brutto)
 - Mehrkosten durch deutlich erhöhte Zeitaufwendungen bei der Stutzensanierung (105 Stück) wegen starken Ausbrüchen
 - Mehrkosten durch mehr Zeitaufwendungen beim Fräsen der verfestigten Ablagerungen
 - Zusätzliche Aufwendungen bei der Schachtsanierung und Einbringung der Schlauchliner

EKVO 2021 – weiteres Vorgehen

- Beauftragung Planungsleistung (ca. 30.000 €)
- Vorplanung Frühsommer 2021
- TV – Vorbefahrung
- Entwurfsplanung Sommer 2021
- Ausschreibung Spätsommer 2021
- Baubeginn Herbst 2021
- Bauende Dezember 2021
