

Straßensanierungsmaßnahme 2023

- Priorisierung


Umland- Beethoven- Haydnstraße - Geplante Ausführung 2021 – Planung abgebrochen Stand Vorplanung										1
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Entenstraße - Unterhaltungsmaßnahmen 2020		schlecht	1949 / 1970	schlecht	mittel	2
---	--	----------	-------------	----------	--------	---


Max-Eyth-Straße – Sanierung Teil West 2022		mittel	?	Aufdimens.	gering	kurzer Abschnitt	2
--	--	--------	---	------------	--------	------------------	---

Hirtenweg	Hirtenweg	Unterhaltungsmaßnahmen 2020	mittel	?	ohne Auffälligk.	gering	kurzer Abschnitt	3
-----------	-----------	-----------------------------	--------	---	------------------	--------	------------------	---

- Uhlandstr. / Beethovenstr. / Haydenstr.
- Lenaustr. / Neuffenstr. / Teckstr. / Hohenstaufenstr.
- Wagnerstraße
- Entenstraße / Mühlenstraße

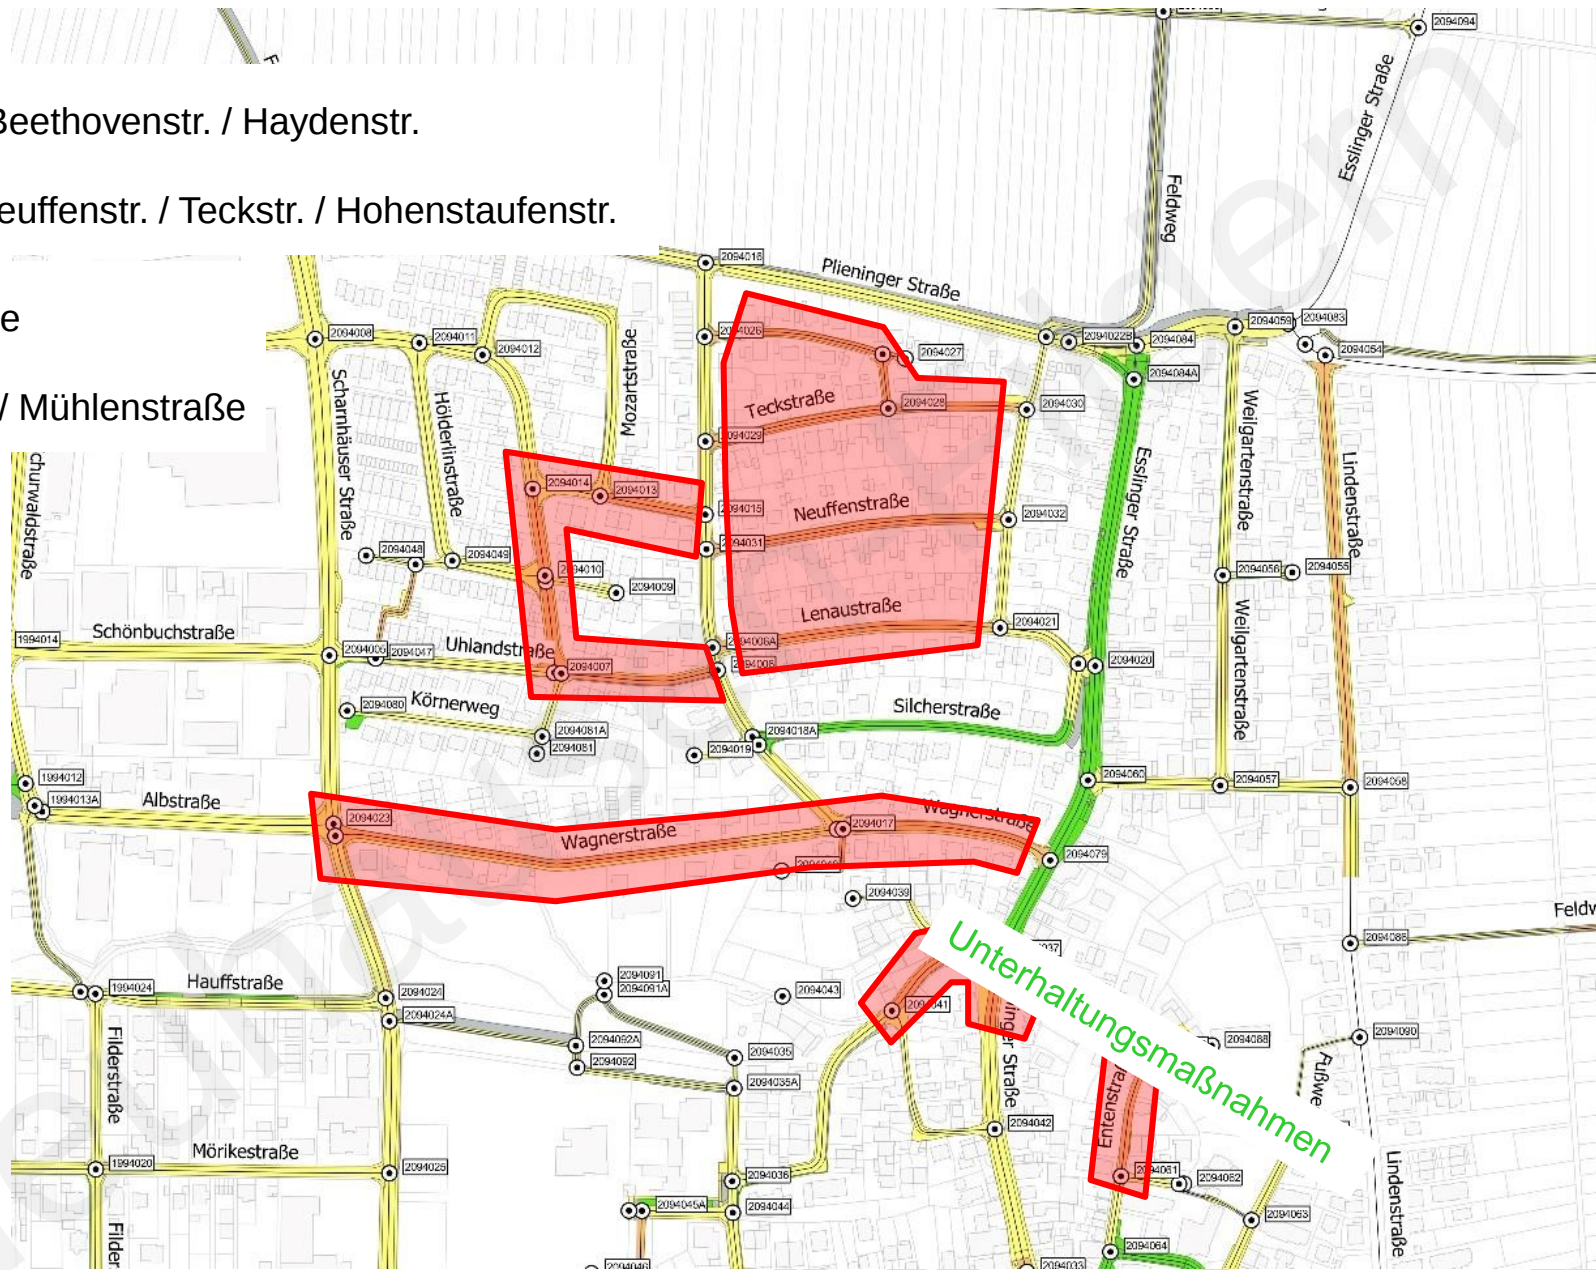


- Bernhäuser Straße
- Benzachweg
- Bahnhofstraße
- Burgstraße / Brachstraße / Untere Bachstraße
- Max-Eyth-Straße

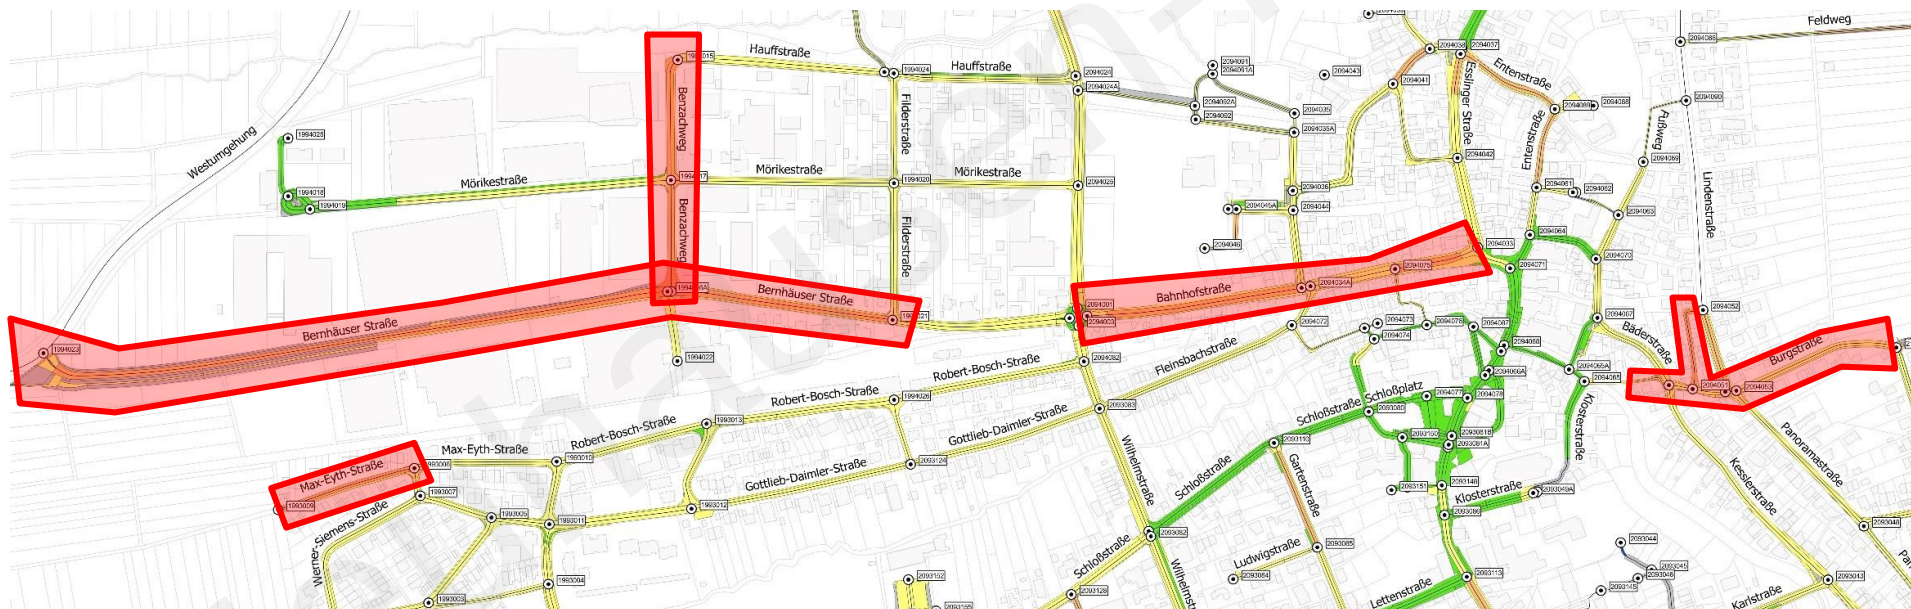

- Hirtenweg
- Rupert-Mayer-Straße (Teilabschnitt)
- Gartenstraße
- Brühlstraße
- Rosenweg
- Adenauerstraße
- Blumenstraße




- Panoramastraße
- Bismarckstraße

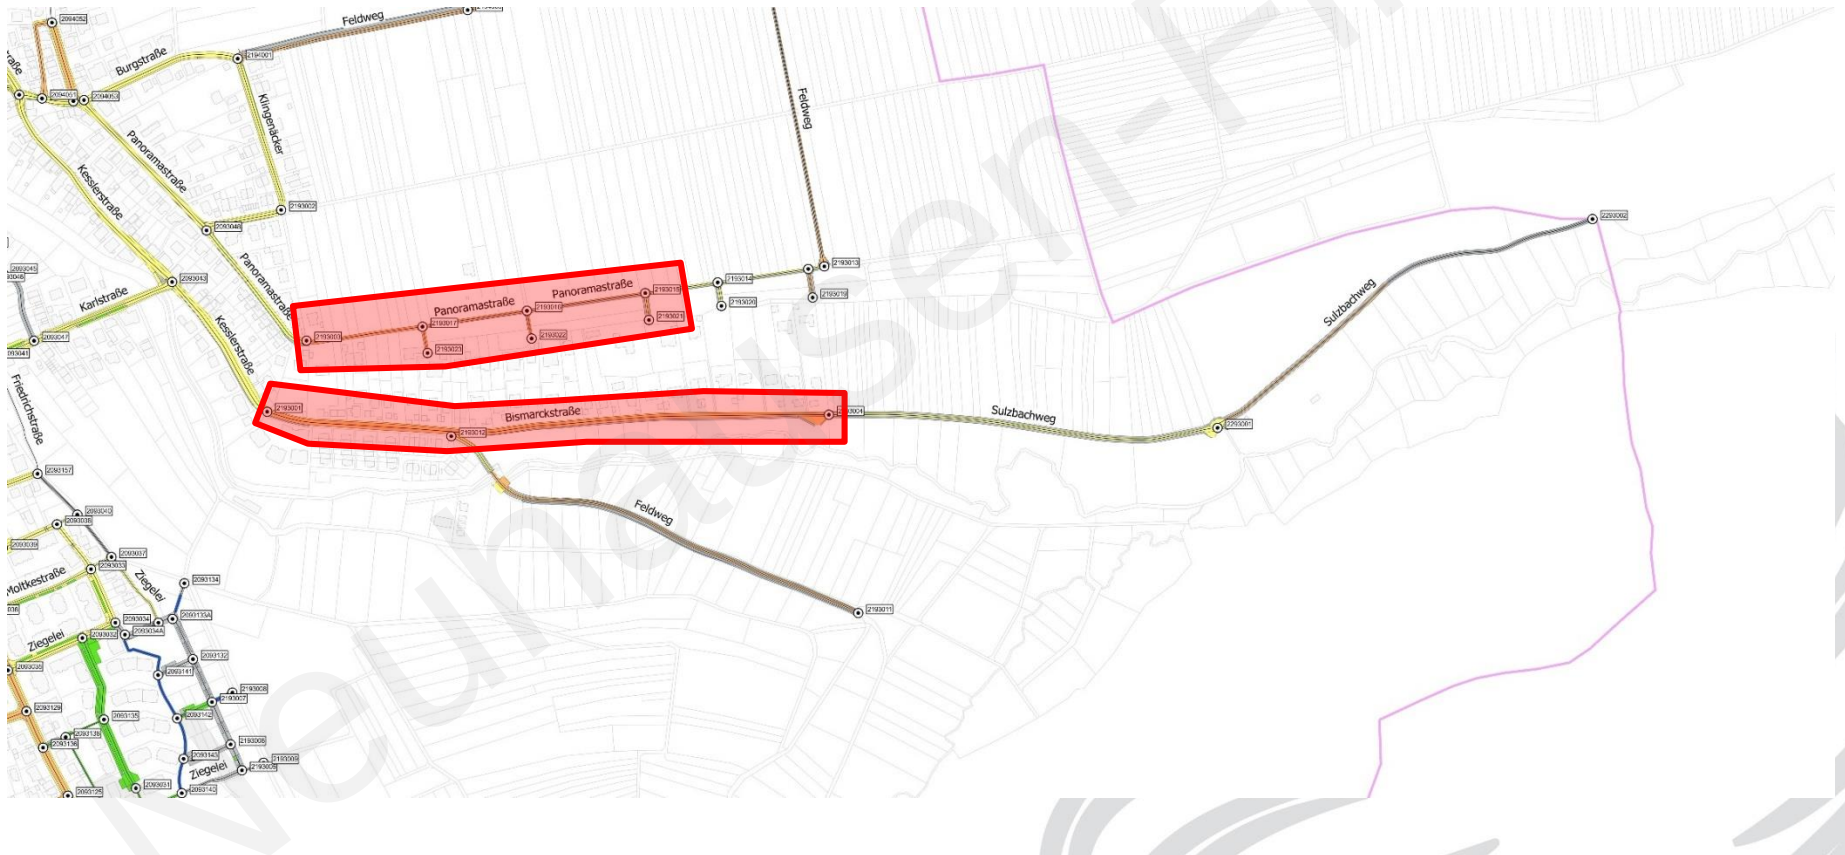

Max-Eyth-Straße West– 2022

- Baubeginn Sommer 2022
- Fertigstellung noch in 2022

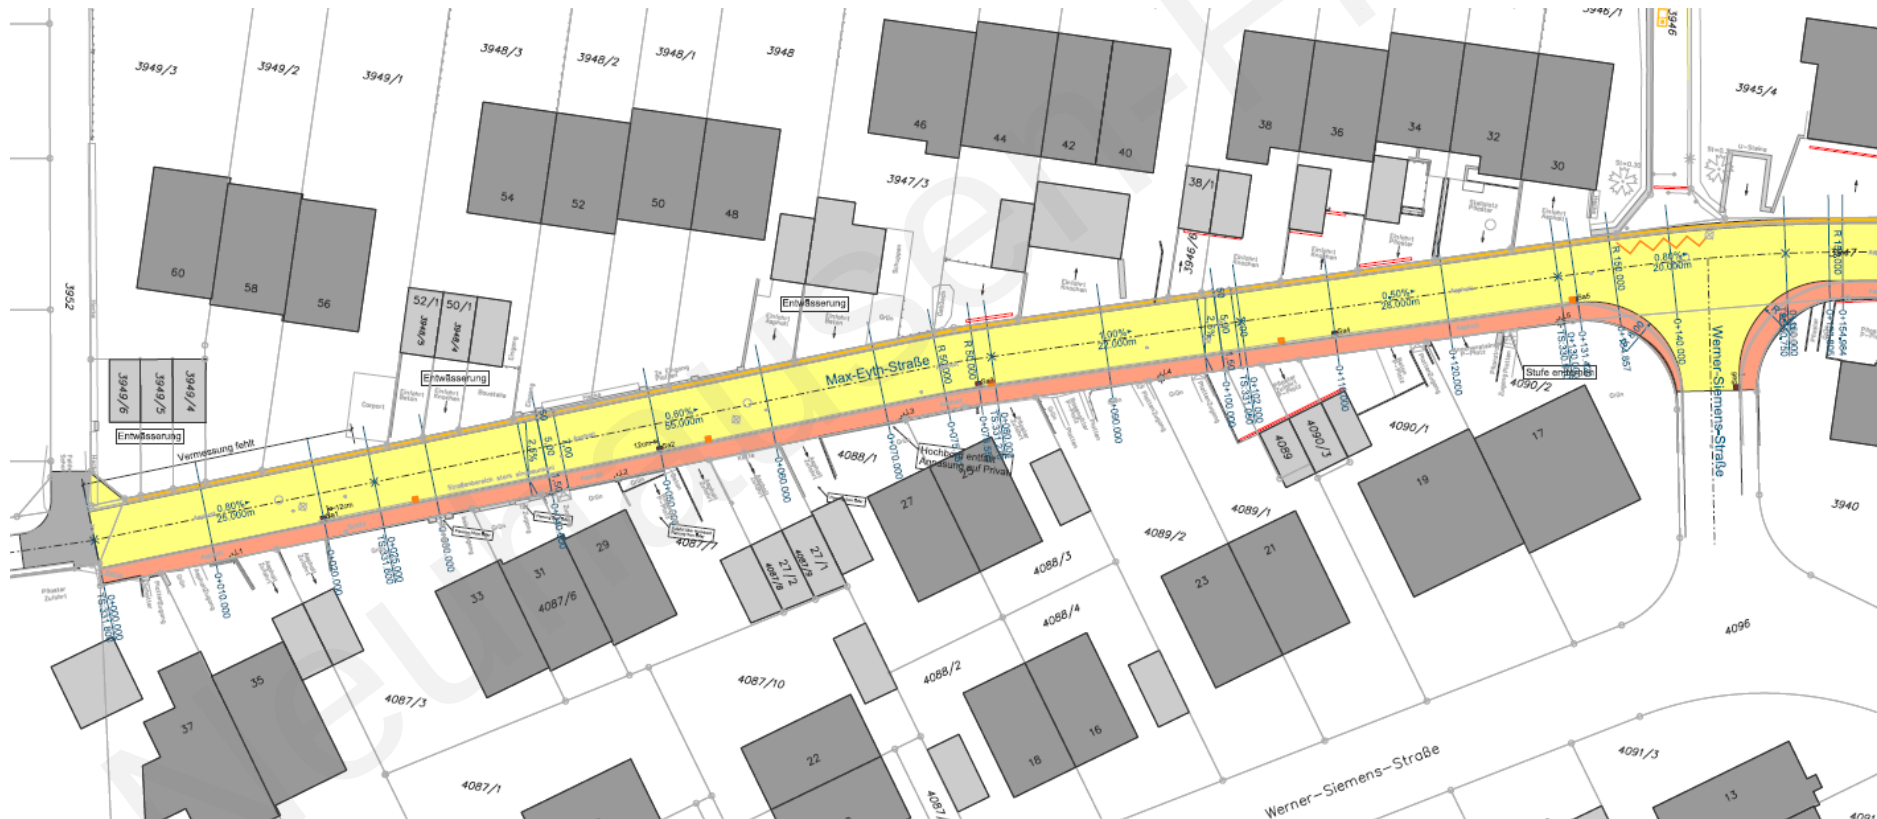


Beethoven- Mozart- Haydnstraße – 2023

Neuhausen
auf den Fildern



- Planungsstand
Vorplanung
- Fortführung der Planung
umgehend – keine Mittel
im Haushalt
berücksichtigt
- Kostenschätzung (Juni
2020) – ca. 1,4 Mio €
(brutto)

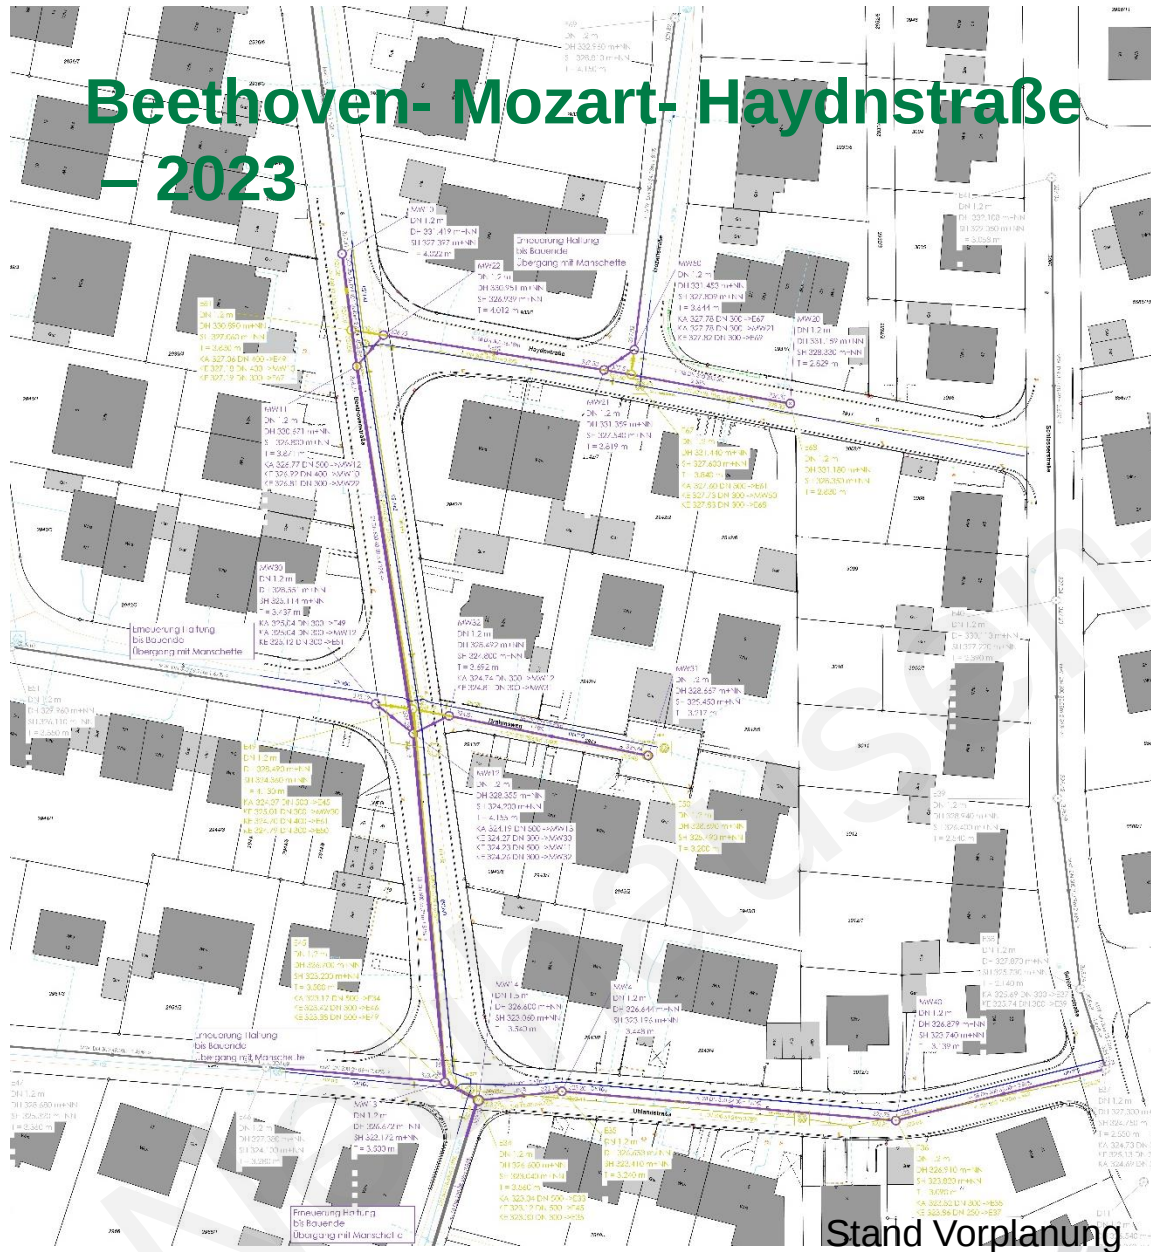

Stand Vorplanung




- Planungsstand
Vorplanung
- Fortführung der Planung
umgehend – keine Mittel
im Haushalt
berücksichtigt
- Kostenschätzung (Juni
2020) – ca. 1,4 Mio €
(brutto)



Kirchstraße und Adenauer Straße – 2024 und 2025

- Weitere Abstimmung mit RP notwendig
- Kanal in Kirchstraße teilweise Hydraulisch überlastet (AKP 2021)
- Ergebnisse Kanalsanierung in 2023
- Planung ggf. in 2023


Auslastung in der Haltung $Q_{\max} / Q_{\text{voll}}$

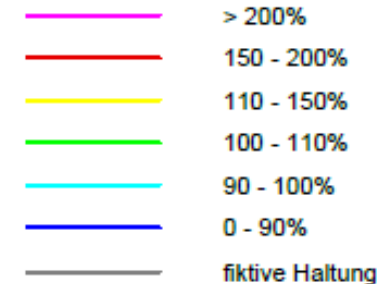

AKP 2021 - Prognose 3 J

Max-Eyth-Straße Ost – 2026 (erstes Halbjahr)

- Planungsstand Entwurfsplanung
- Ausführungsplanung und Ausschreibung noch im Jahr 2025

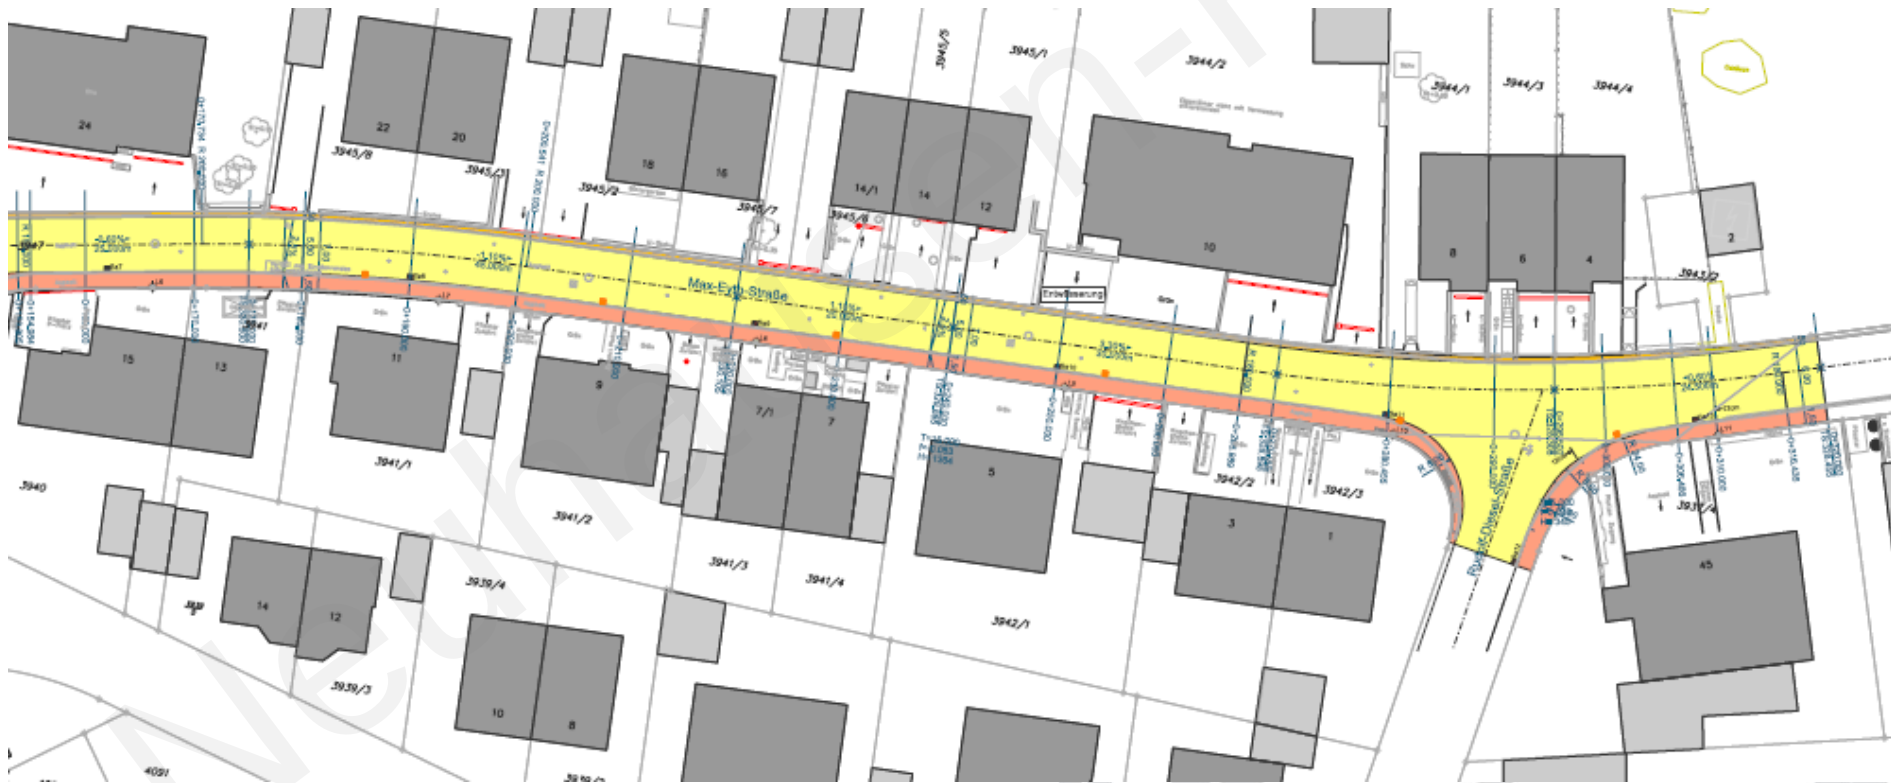

Bismarckstraße – 2026 (zweites Halbjahr) und 2027

- Planung noch in 2025
- Ausführung nach Abschluss Kläranlagensanierung



- Max-Eyth-Straße West– **2022**
- Beethoven- Mozart- Haydnstraße – **2023** (Abhängig von Planung – akt. Planungsstand Vorplanung)
- Kirchstraße durch RP – Kanalabschnitt aus AKP ggf. mit Teil Adenauerstr und ggf. Einmündung Blumenstraße **2024 - 2025**
- Max-Eyth-Straße Ost **2026 (1. Halbjahr)** akt. Planungsstand Entwurfsplanung
- Bismarckstraße **2026 (2. Halbjahr) – 2027** nach Fertigstellung Kläranlage

mögliche Variante

- Max-Eyth-Straße West– **2022**
- Max-Eyth-Straße Ost **2023 (1. Halbjahr)** akt. Planungsstand
Entwurfsplanung
- Beethoven- Mozart- Haydnstraße – **2023 (2. Halbjahr) - 2024 (1. Halbjahr)**
- Kirchstraße durch RP – Kanalabschnitt aus AKP ggf. mit Teil
Adenauerstr und Einmündung Blumenstraße **2024 - 2025**
- Bismarckstraße **2026 (2. Halbjahr) – 2027** nach Fertigstellung
Kläranlage
