



## Akademiegärten – Sachstand Erschließung





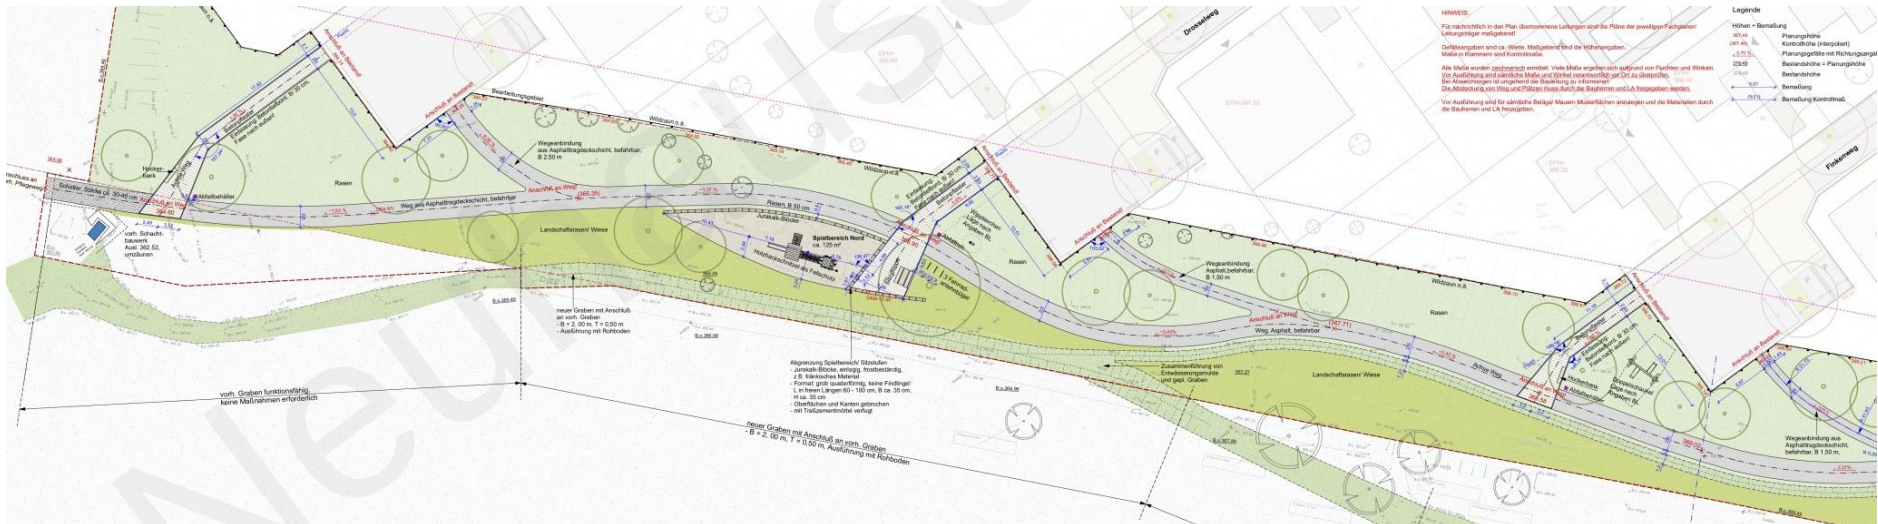

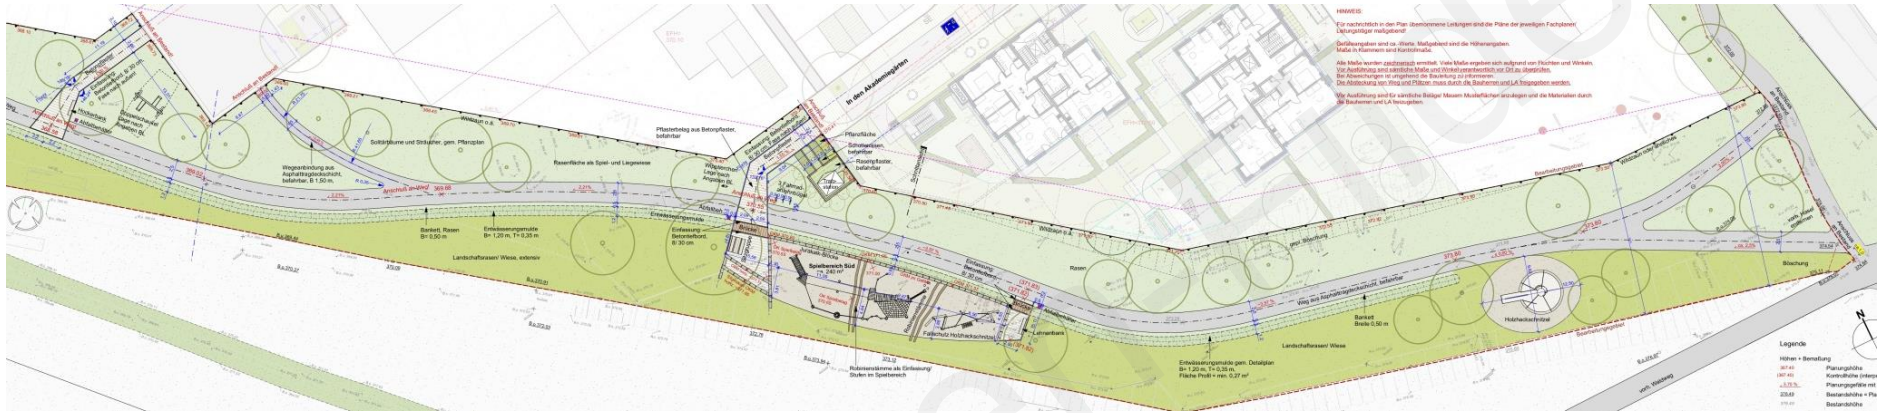









|                                                         | Gesamtkosten                                | geleistete Zahlungen<br>Gemeinde | Ausstehende<br>Zahlungen Gemeinde |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>städtebauliche<br/>Planungsleistungen</b>            | 270.321,54 € brutto                         | 135.160,77 € brutto              |                                   |
| <b>Allgemeine Kosten</b>                                | 15.376,98 € brutto                          | 7.688,49 € brutto                |                                   |
| <b>Abbruch</b>                                          | 770.069,57 € brutto                         | 385.034,84 € brutto              |                                   |
| <b>Summe</b>                                            | <b>1.055.768,06 € brutto</b>                | <b>527.884,1 € brutto</b>        |                                   |
|                                                         |                                             |                                  |                                   |
| <b>Baufeldfreimachung</b>                               | 621.078,24 € brutto                         | 310.539,12 € brutto              |                                   |
|                                                         |                                             |                                  |                                   |
| <b>Erschließung mit<br/>„Grünfuge“</b>                  | 3.653.617,63 € brutto<br>(Prognose)         | 1.303.382,46 € brutto            | ca. 210.000 € brutto              |
|                                                         |                                             |                                  |                                   |
| <b>Spielgeräte und „5-<br/>Esslinger“</b>               | 72.300,02 € brutto                          | 36.150,01 € brutto               |                                   |
|                                                         |                                             |                                  |                                   |
| <b>Straßenbeleuchtung<br/>(Masten und<br/>Leuchten)</b> | 74.697,16 € brutto                          | 30.849,92 € brutto               |                                   |
|                                                         |                                             |                                  |                                   |
| <b>Heizzentrale</b>                                     | 659.848,29 € brutto<br>(Prognose)           | 164.501,19 € brutto              | ca. 90.000 € brutto               |
| <b>Baukostenzuschuss<br/>Heizleitung</b>                | 181.944,64 € brutto                         | 89.420,34 € brutto               |                                   |
| <b>Summe</b>                                            | <b>841.792,93 € brutto</b>                  | <b>253.921,53 € brutto</b>       |                                   |
|                                                         |                                             |                                  |                                   |
| <b>Radweg</b>                                           | 85.971,80 € brutto                          | 16.556,13 € brutto               |                                   |
|                                                         |                                             |                                  |                                   |
| <b>Gesamtkosten</b>                                     | <b>6.405.225,84 € brutto<br/>(Prognose)</b> | <b>2.479.283,27 € brutto</b>     | <b>ca. 300.000 € brutto</b>       |
