


Akademiegärten – Sachstand Erschließung







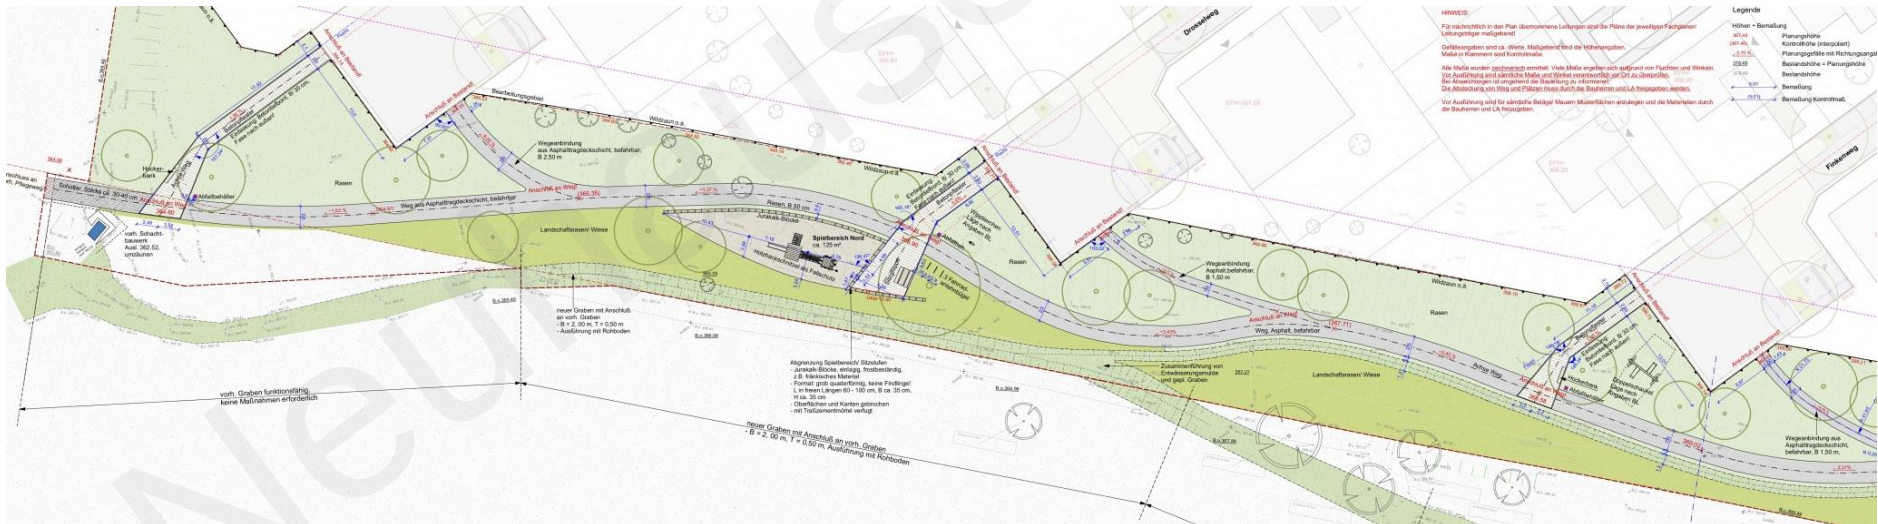

Neuhausen
auf den Fildern









	Gesamtkosten	geleistete Zahlungen Gemeinde	Ausstehende Zahlungen Gemeinde
städtebauliche Planungsleistungen	270.321,54 € brutto	135.160,77 € brutto	
Allgemeine Kosten	15.376,98 € brutto	7.688,49 € brutto	
Abbruch	770.069,57 € brutto	385.034,84 € brutto	
Summe	1.055.768,06 € brutto	527.884,1 € brutto	
Baufeldfreimachung	621.078,24 € brutto	310.539,12 € brutto	
Erschließung mit „Grünfuge“	3.653.617,63 € brutto (Prognose)	1.303.382,46 € brutto	ca. 210.000 € brutto
Spielgeräte und „5- Esslinger“	72.300,02 € brutto	36.150,01 € brutto	
Straßenbeleuchtung (Masten und Leuchten)	74.697,16 € brutto	30.849,92 € brutto	
Heizzentrale	659.848,29 € brutto (Prognose)	164.501,19 € brutto	ca. 90.000 € brutto
Baukostenzuschuss Heizleitung	181.944,64 € brutto	89.420,34 € brutto	
Summe	841.792,93 € brutto	253.921,53 € brutto	
Radweg	85.971,80 € brutto	16.556,13 € brutto	
Gesamtkosten	6.405.225,84 € brutto (Prognose)	2.479.283,27 € brutto	ca. 300.000 € brutto
