



## Akademiegärten – Sachstand Erschließung



# Quartiersplätze

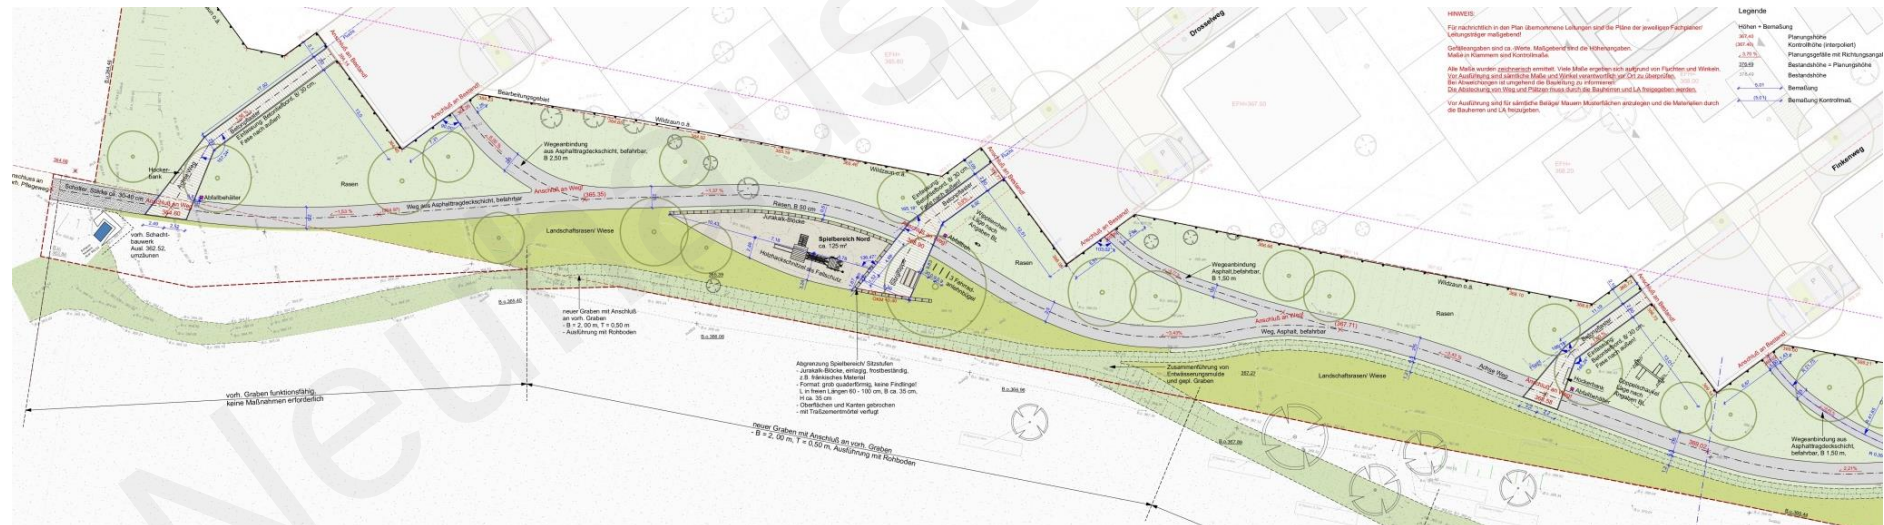

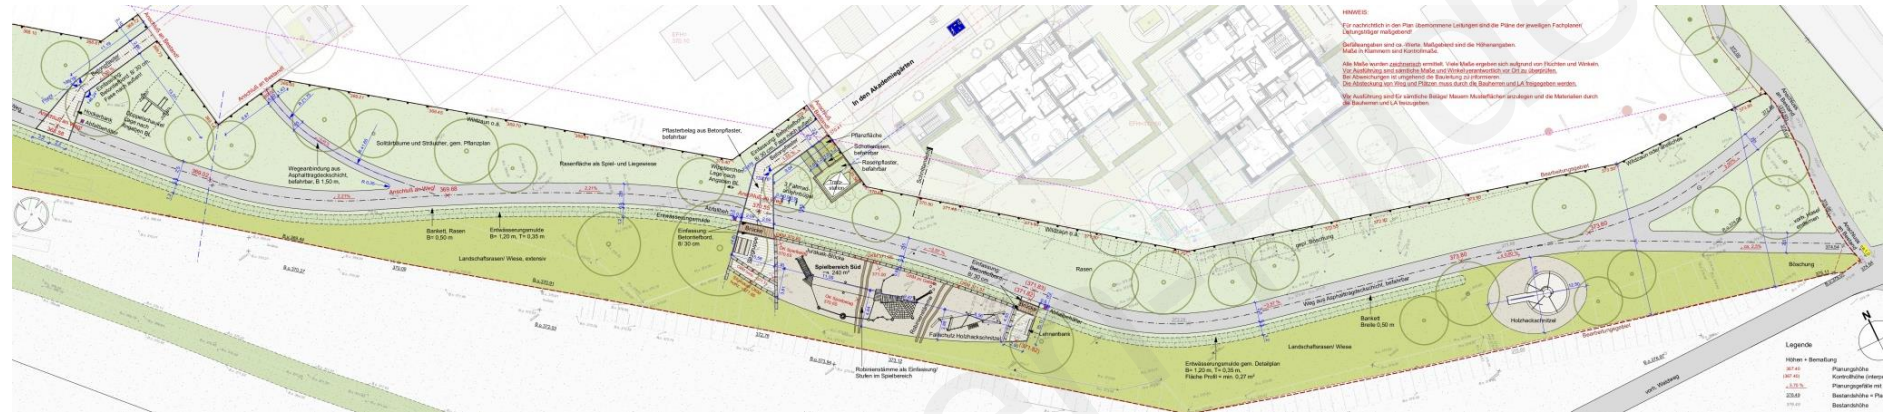






**Neuhausen**  
auf den Fildern



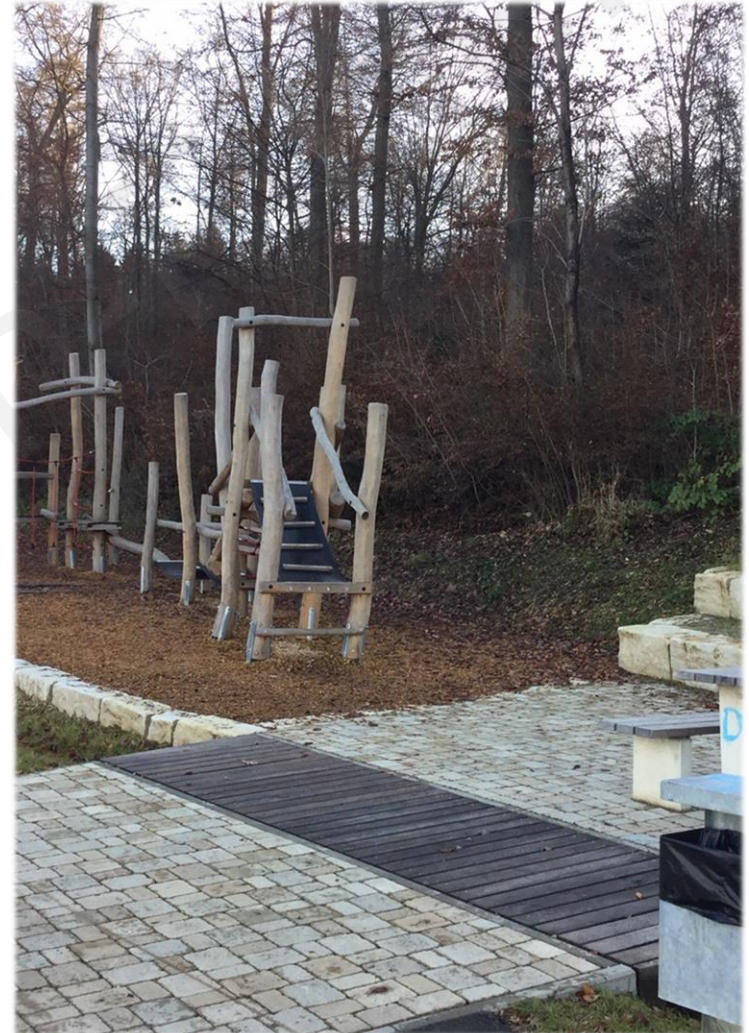





|                                                | Gesamtkosten                                | geleistete Zahlungen<br>Gemeinde | Ausstehende<br>Zahlungen Gemeinde |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| städtebauliche<br>Planungsleistungen           | 270.321,54 € brutto                         | 135.160,77 € brutto              |                                   |
| Allgemeine Kosten                              | 15.376,98 € brutto                          | 7.688,49 € brutto                |                                   |
| Abbruch                                        | 770.069,57 € brutto                         | 385.034,84 € brutto              |                                   |
| Summe                                          | <b>1.055.768,06 € brutto</b>                | <b>527.884,1 € brutto</b>        |                                   |
|                                                |                                             |                                  |                                   |
| Baufeldfreimachung                             | 621.078,24 € brutto                         | 310.539,12 € brutto              |                                   |
|                                                |                                             |                                  |                                   |
| Erschließung mit<br>„Grünfuge“                 | 3.653.617,63 € brutto<br>(Prognose)         | 1.303.382,46 € brutto            | ca. 210.000 € brutto              |
|                                                |                                             |                                  |                                   |
| Spielgeräte und „5-<br>Esslinger“              | 72.300,02 € brutto                          | 36.150,01 € brutto               |                                   |
|                                                |                                             |                                  |                                   |
| Straßenbeleuchtung<br>(Masten und<br>Leuchten) | 74.697,16 € brutto                          | 30.849,92 € brutto               |                                   |
|                                                |                                             |                                  |                                   |
| Heizzentrale                                   | 659.848,29 € brutto<br>(Prognose)           | 164.501,19 € brutto              | ca. 90.000 € brutto               |
| Baukostenzuschuss<br>Heizleitung               | 181.944,64 € brutto                         | 89.420,34 € brutto               |                                   |
| Summe                                          | <b>841.792,93 € brutto</b>                  | <b>253.921,53 € brutto</b>       |                                   |
|                                                |                                             |                                  |                                   |
| Radweg                                         | 85.971,80 € brutto                          | 16.556,13 € brutto               |                                   |
|                                                |                                             |                                  |                                   |
| Gesamtkosten                                   | <b>6.405.225,84 € brutto<br/>(Prognose)</b> | <b>2.479.283,27 € brutto</b>     | ca. 300.000 € brutto              |
